

都市計画道路 富士見通南立石線(南立石工区)工事進捗のお知らせ

令和元年10月1日

別府土木事務所

道路課改良班

大分県が別府市で整備を進めています都市計画道路 富士見通南立石線(南立石工区)の工事進捗についてお知らせします。

記

事業箇所：都市計画道路 富士見通南立石線 別府市大字南立石

延長：L = 1,300m

完了予定：令和3年度末

事業概要：参考資料①参照(裏面)

進捗率：92%(事業費ベース)平成31年3月末時点

遅延理由：掘削土砂の処分に時間を要している等

今後の予定

・令和元年度

道路切替計画検討・土工事・法面工事・舗装工事

・令和2年度以降

道路切替工事・土工事・法面工事・舗装工事・防護柵工事等

備考：道路切替計画を決定後、再度お知らせ致します。


【問い合わせ先】

別府土木事務所 道路課 清永, 高榎, 松本

電話：0977-67-0211(代表)

0977-67-0214(道路課)

位置図

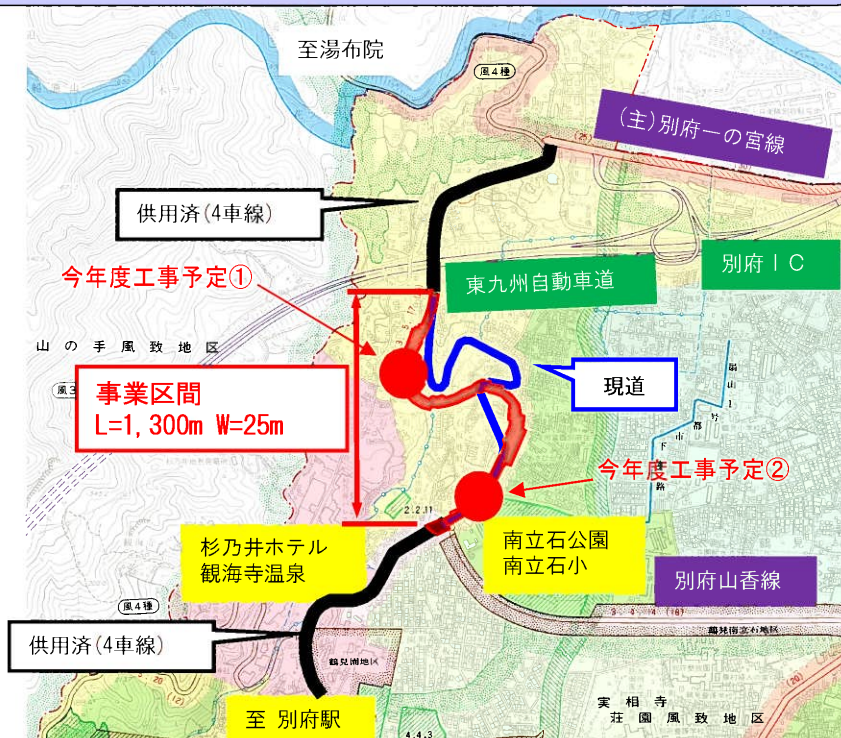


計画概要

事業箇所	みなみたていし 別府市大字南立石
延長	L=1,300m
幅員	W=13.0(25.0)m
事業期間	平成6年度～令和3年度
事業費	約 117 億円

横断図

【単位:m】



現道の状況

▼幅員狭小



令和元年度工事予定箇所

① 土工事・法面工事



② 舗装工事

