

令和2年7月豪雨災害 復旧・復興推進計画の進捗状況

令和3年11月30日

(目 次)

<u>I 被災者への支援</u>	
1 医療救護活動・保健衛生活動等	1
2 暮らし・住宅再建の支援	1
3 弔慰金・資金等による支援	3
<u>II 農林水産業・商工観光業への支援</u>	
1 農林水産業の再建	5
2 中小企業・小規模事業者の再建	8
3 観光業の再建	9
<u>III 教育施設・文化財等の復旧・復興</u>	
1 学校施設・教育の復旧・復興	10
2 社会教育施設・文化財の復旧	10
<u>IV 社会資本等の復旧・復興</u>	
1 道路・河川等の復旧	11
2 農地・農業用施設等の復旧	14
3 ため池の復旧	14
4 治山施設・林道等の復旧	15
5 その他施設の復旧	17
6 JRの復旧	18
<u>V 復旧・復興に係る人的・財政支援</u>	
1 人的支援	19
2 財政支援	21
<u>VI 各事業所管部局と進捗管理</u>	
1 事業所管部局	22
2 進捗管理	23
<u>参考 被害状況</u>	26

(令和3年11月12日現在)

I 被災者への支援

1 医療救護活動・保健衛生活動等

- (1)医療救護活動(延べ58人) **完了**
・郡市医師会「巡回医療チーム」(7月6日～18日:日田市、九重町、玖珠町)
・三愛メディカルセンターDMAT(7月8日:竹田市)
・済生会日田病院DMAT (7月9日:日田市)
・災害支援ナース (7月13日～17日:日田市、由布市)
- (2)保健衛生活動(延べ164人) **完了**
・専門職等(保健師、獣医師、薬剤師等)による市町村保健衛生活動支援
・保健師による避難所及び家庭訪問での健康状態の把握
(7月7日～8月6日:日田市、由布市、九重町、玖珠町)
- (3)精神保健活動(延べ26人) **完了**
・こころとからだの相談支援センター等による保健師、心理士等への心理教育や指導・助言
(7月13日:由布市、10月19日:日田市)
・保健師、心理士による被災地区巡回、健康状態の把握(7月14日～15日:由布市)
・保健師、心理士等による被災者の精神ケアの実施(8月6日、9月28日:九重町)
- (4)子どもの心のケア **完了**
・中津児童相談所による避難所等での子どもやその家族の心のケア支援
- (5)犯罪防止活動 **完了**
・警察本部編成の特別警戒部隊による24時間体制での避難地域の警戒活動
・女性警察官等による避難所への立ち寄り防犯活動
(7月13日～19日:日田市、九重町、由布市)

2 暮らし・住宅再建の支援

(1)災害ボランティア等による支援

市町村名	災害ボランティア(人)	援農隊(人)	防災エキスパート(人)	大分県測量設計 コンサルタンツ協会(人)
日田市	2,455		42	182
由布市	164			
九重町	2,293	6		
玖珠町				
その他				76
合計	4,912	6	42	258
支援期間	R2.7/10～8/28	～R2.7/29～	R2.7/15～7/17	R2.7/13～7/17
支援状況	完了	完了	完了	完了

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、災害ボランティアの募集範囲を県内在住者に限定

(2)災害廃棄物処理

市町村名	処理済量(トン)
日田市	6,522
由布市	1,995
九重町	5,363
玖珠町	1,247
合計	15,127

(3)罹災証明の発行

大分市 80件(7/8～)
 日田市 237件(7/9～)
 由布市 106件(7/8～)
 九重町 196件(7/8～)
 玖珠町 57件(7/8～)
 その他市町村 18件 合計 694件

(4)みなし仮設住宅及び公的賃貸住宅への被災者の受入状況

市町村名	みなし仮設住宅		県営住宅		県職員住宅		市営住宅		合計	
	入居中	入居実績	入居中	入居実績	入居中	入居実績	入居中	入居実績	入居中	入居実績
日田市	13	19戸	1	2戸	1	1戸	11	25戸	26	47戸
	29	53人	2	6人	2	2人	19	61人	52	122人
由布市	2	2戸					0	16戸	2	18戸
	6	6人					0	30人	6	36人
九重町	0	3戸	1	1戸			9	11戸	10	15戸
	0	5人	2	2人			18	25人	20	32人
玖珠町			1	1戸			0	3戸	1	4戸
			1	1人			0	8人	1	9人
大分市			0	2戸			0	3戸	0	5戸
			0	5人			0	6人	0	11人
その他									0	0戸
									0	0人
合計	15	24戸	3	6戸	1	1戸	20	58戸	39	89戸
	35	64人	5	14人	2	2人	37	130人	79	210人

(5)水道施設の復旧

断水は8/17までに全て解消(最大3,314戸)

民営水道の地元負担を半減させるため県独自で上乗せ支援

種別	被災施設数	本復旧見込み	
		応急復旧	本復旧
公営水道	8	6	2
民営水道	19	0	19
合計	27	6	21

令和4年3月～令和5年3月
 復旧済

(6)義援金等の募集、配分 完了

①義援金受付額(募集期間:7/13~12/28)

内容	金額(円)
大分県	259,000,655
日本赤十字社大分県支部	242,750,008
大分県共同募金会	29,839,762
合 計	531,590,425

②義援金配分額

第一次配分額(第1回配分委員会8/6、8/11~配分)	40,750,000
第二次配分額(第2回配分委員会10/26、10/28~配分)	287,690,000
第三次配分額(第3回配分委員会2/26、3/3配分)	203,150,425

③寄付金

28,333,388

3 弔慰金・資金等による支援

(1)災害弔慰金等の支給 完了

日田市 1件 由布市 5件 合計 6件

(2)災害援護資金の貸付 完了

市町村名	相談件数	申請件数	貸付件数	貸付額(千円)
日田市	3	2	2	3,400
由布市	3	1	1	3,500
九重町				
玖珠町				
その他				
合 計	6	3	3	6,900

(3)生活福祉資金(緊急小口資金の災害特例)の貸付 完了

市町村名	相談件数	申請件数	貸付件数	貸付額(千円)
日田市	1	1	1	200
由布市				
九重町	2	2	2	200
玖珠町				
その他	1	1	1	100
合 計	4	4	4	500

(4)被災者生活再建支援金の支給(国制度)

市町村名	被災世帯数	基礎支援金	加算支援金	支給済金額(千円)
		支給済世帯数	支給済世帯数	
日田市	62	62	27	66,000
由布市	17	17	6	18,500
九重町	39	33	20	44,500
玖珠町	3	3	2	7,000
合計	121	115	55	136,000

(5)大分県災害被災者住宅再建支援金の支給(県制度)

市町村名	被災世帯数	基礎支援金	加算支援金	支給済金額(千円)
		支給済世帯数	支給済世帯数	
日田市	67	67	19	34,005
由布市	30	30	5	9,346
九重町	48	48	30	44,187
玖珠町	29	29	15	16,946
その他	48	48	5	9,494
合計	222	222	74	113,978

【(4)(5)申請期間】
基礎支給金
:発災から13ヶ月
加算支給金
:発災から37ヶ月

(6)県税の減免等

相談件数:13件(納税5件、減免8件)

減免実績:2件、13,200円

(7)県使用料・手数料の減免

減免実績 45件、2,600,602円

II 農林水産業・商工観光業への支援

1 農林水産業の再建

(1) 農業者への支援

① 相談窓口を県振興局に設置(7月9日)

相談件数 32件 (排水対策、給水対策、農地災害、道路寸断への対応など)

② 金融支援等

○ 被災農業者特別利子助成(国制度)

経営再建に向けて無利子の資金を貸付 11件(日本政策金融公庫資金)

○ 借入資金の償還猶予

既借入金の償還猶予 4件(日本政策金融公庫資金)

○ 農業共済等

・ 農家への共済金支払実績

種別	戸数	面積等	支払額(千円)	市町村名	状況
農作物共済(水稲)	71	12.6ha	7,897	玖珠町、九重町、由布市、日田市	収穫皆無 (令和2年9月10日支払)
家畜共済(牛)	2	7頭	3,025	九重町、日田市	令和2年7月29日支払
園芸施設共済	14	29棟	1,780	九重町、日田市、大分市	令和2年8月7日支払
合計	87		12,702		

・ 農業共済掛金等の払込期限の延長措置

農作物共済(水稲)、畑作物共済(大豆)、果樹共済の支払期限について、収穫期の1ヵ月前までを限度に最長令和2年10月31日まで延長し、家畜共済・園芸施設共済・任意共済(建物・農機)の共済掛金等の支払期限を令和2年10月31日まで延長

掛金等払込期限延長戸数:(水稲)43戸 (園芸施設)52戸

○ 収入保険におけるつなぎ融資等

・ 農家へのつなぎ融資実績

種別	戸数	主な品目	支払額(千円)	市町村名	状況
つなぎ融資	1	トマト	1,400	九重町	令和2年9月11日融資
	1	花き	2,500	日田市	令和2年8月21日融資

○ 被災地(農地中間管理事業を活用した借入農地)の賃料支援

被災農家の負担を軽減するため、中間管理機構が貸付農地の賃借料を全額負担

R2:8筆 52千円 R3:12筆 273千円

③各種助成等

○農業用ハウスや農業用機械等の復旧への支援、水田農業への支援

支援内容	市町村名	件数	金額(千円)	復旧済	未復旧	状況
野菜関係施設等	日田市	2	449	2	0	7月に復旧完了
	由布市	3	3,306	3	0	
	九重町	3	901	3	0	
	大分市	1	920	1	0	
果樹関係施設等	玖珠町	1	153	1	0	
花き関係施設等	九重町	1	101	1	0	
水田関係施設等	日田市	7	81,778	7	0	9月に復旧完了
	由布市	6	14,713	6	0	
	九重町	4	3,408	4	0	
	玖珠町	2	9,279	2	0	
	竹田市	1	2,200	1	0	
合計		31	117,208	31	0	

○土壌改良や農業用水確保等への支援

日田市:種苗、農薬支援 10戸 1,617千円

○畜産農家への支援

支援内容	市町村名	件数	金額(千円)	復旧済	未復旧	状況
乳牛導入	日田市	2	7,151	2	0	
	九重町	1	2,650	1	0	
酪農関係施設等	日田市	7	33,659	7	0	7月に復旧完了
	九重町	5	12,096	5	0	
	玖珠町	1	4,356	1	0	
肉用牛関係施設等	日田市	1	685	1	0	10月に復旧完了
	由布市	3	29,954	3	0	
	九重町	3	1,786	3	0	
	玖珠町	4	1,833	4	0	
	竹田市	1	2,294	1	0	
合計		28	96,464	28	0	

④鳥獣被害防止施設の復旧支援

市町村名	被害合計		復旧済		未復旧		備考
	地区数	延長(m)	地区数	延長(m)	地区数	延長(m)	
日田市	36	1,784	21	410	15	1,374	21地区復旧済 15地区R3年度復旧見込(農地復旧後)
由布市	15	275	13	245	2	30	2地区R4年度復旧見込(農地復旧後)
九重町	23	5,321	20	4,421	3	900	20地区年度内復旧済 3地区R5年度復旧見込(農地復旧後)
玖珠町	7	1,710	0	0	7	1,710	4地区R3年度復旧見込(農地復旧後) 1地区R4年度復旧見込(農地復旧後) 2地区R5年度復旧見込(農地復旧後)
大分市	1	20	1	20	0	0	復旧済
中津市	1	112	1	112	0	0	復旧済
竹田市	23	3,334	22	2,884	1	450	22地区復旧済 1地区R3年度復旧見込(農地復旧後)
国東市	1	18	1	18	0	0	復旧済
計	107	12,574	79	8,110	28	4,464	

(2)林業者への支援

①相談窓口を県振興局に設置(7月9日)

相談件数 8件(資材の浸水対策、治山被害確認の依頼など)

②各種助成等

○木材加工流通施設等の復旧支援

支援内容	市町村名	件数	金額(千円)	復旧済	未復旧	状況
製材機械	日田市	3	104,258	3	0	

○しいたけ等の生産施設の復旧支援

支援内容	市町村名	件数	金額(千円)	復旧済	未復旧	状況
ハウス・ほだ木等	日田市	6	2,695	6	0	
	由布市	1	385	1	0	
	九重町	10	100,529	10	0	R3年9月に復旧完了
	玖珠町	7	3,328	6	1	R4年3月末復旧見込
	竹田市	1	183	1	0	
合計		25	107,120	24	1	

(3)水産業者への支援

①相談窓口を県振興局に設置(7月9日)

相談件数 3件(流木撤去)

②各種助成等

○内水面養殖施設等の復旧支援

支援内容	市町村名	件数	金額(千円)	復旧済	未復旧	状況
施設等	日田市	4	7,878	4	0	
	九重町	1	6,028	1	0	
	玖珠町	1	319	1	0	
合計		6	14,225	6	0	

2 中小企業・小規模事業者の再建

	被災事業者数	なりわい再建補助金活用状況				事業再開状況		
		申請済	申請準備中	自力再建	廃業	再開済	休業中	廃業
日田市	112	37	1	69	5	90	17	5
由布市	45	11	1	32	1	43	1	1
九重町	43	19	1	23	0	39	4	0
玖珠町	12	5	0	6	1	11	0	1
竹田市	10	2	0	8	0	9	1	0
大分市	6	2	0	4	0	6	0	0
中津市	2	0	0	2	0	2	0	0
杵築市	1	0	0	1	0	1	0	0
日出町	1	0	0	1	0	1	0	0
計	232	76	3	146	7	202	23	7

(1)相談窓口を経営創造・金融課内に設置(7/8～)

相談件数 68件 (なりわい再建補助金に関する相談件数含む)

(2)施設等の復旧支援

①なりわい再建補助金

市町村名	申請件数	金額(千円)	採択件数	金額(千円)	状況
日田市	37	939,339	36	931,267	
由布市	11	224,273	11	224,273	
九重町	19	687,450	18	685,775	
玖珠町	5	86,490	5	86,490	
竹田市	2	37,654	2	37,654	
大分市	2	62,914	1	411	
合計	76	2,038,120	73	1,965,870	

②持続化補助金(被災小規模事業者再建事業)

市町村名	申請件数	採択件数	金額(千円)	状況
由布市	13	12	27,416	
九重町	10	9	17,105	
日田市	15	13	24,490	
玖珠町	2	2	3,507	
杵築市	3	3	2,662	
大分市	2	0	0	
別府市	1	1	1,000	
竹田市	1	1	2,500	
合計	46	40	78,680	※国補助金募集終了

(3)金融支援

①県制度資金(災害復旧資金(知事指定災害融資))[運転・設備]

実質利率0.9%

市町村名	貸付件数	貸付額
日田市	1	8,000 万円
由布市	0	0 万円
玖珠町	1	3,000 万円
九重町	0	0 万円
合計	2	1億1,000 万円

※金融機関は、災害復旧に利用可能なコロナ関連資金を優先的に利用促進(実績は下記③)

※今後、なりわい再建補助金のつなぎ融資や自己負担分の資金としての利用が見込まれる

※本資金は、セーフティネット保証4号の認定と、市町村の罹災証明又は被災証明が必要

②日本政策金融公庫融資(令和2年7月豪雨特別貸付)[運転・設備]

市町村名	貸付件数	貸付額
日田市 由布市 玖珠町 九重町 他	8	1億5,450 万円

※コロナの影響も受けている場合は、コロナ特別資金の優先利用を薦めている(災害資金は無利息期間がないため)

③コロナ関連資金(がんばろう資金(3年間無利子)+新型コロナ対策資金)実績

(R2.7~R3.9)

市町村名	貸付件数	貸付額
日田市	836	94億3,407 万円
由布市	454	53億6,995 万円
玖珠町	181	11億5,207 万円
九重町	94	9億7,295 万円
小計	1,565	169億2,904 万円
その他の市町村	11,253	1,213億7,672 万円
合計	12,818	1,383億576 万円

※コロナの影響を受けている県内中小企業であれば、災害からの復旧に必要な設備・運転資金にコロナ関連資金を利用可能

3 観光業の再建

○天ヶ瀬温泉、日田温泉、宝泉寺温泉、湯平温泉の被災宿泊施設25施設がなりわい再建補助金を申請し、再建中

○旅行代金の割引について災害復旧や感染状況を注視しながら重点的に支援(調整中)

・旅行代金の割引原資を被災地域に重点配分、加えて地域クーポン券を上乗せ

○被災地域について重点的にSNSやテレビ番組等を活用した観光情報を発信するとともに、旅行代金の割引支援についても災害復旧や感染状況を注視しながら実施に向けて調整中(情報発信)

ツーリズムおおいたのHPで、施設や交通の状況など正確な情報を発信(7月~1月)
Instagram投稿を募集し、優秀作品に賞品をプレゼントするコンテストを実施(11月~2月)
県内3局及び福岡県2局で観光情報の紹介コーナーを設けて、11回放送(11月~3月)
SNSやWEB等のメディアを活用した情報発信の強化(R3年度予定)

Ⅲ 教育施設・文化財等の復旧・復興

1 学校施設・教育の復旧・復興

(1) 学校施設の復旧等

種別	被災校数	復旧済	今後の主な復旧見込み
県立	3	2	・久住高原農業高(法面崩壊)については、土地所有者との協議終了後に復旧予定
市町村立	5	5	
私立	1	1	
合計	9	8	

(2) 被災した児童・生徒への対応

①心のケア

- ・被災学校へのスクールカウンセラーの派遣
派遣実績 延べ16人、対応児童生徒95人(5校)

②通学用の臨時バスの運行

- ・17ルート28台運行(7/9～8/7)
利用実績 延べ10,794人

2 社会教育施設・文化財の復旧

(1) 社会教育施設の復旧

種別	被災施設数	復旧済	今後の主な復旧見込み
社会教育施設	1	1	
体育施設	5	5	
合計	6	6	

(2) 文化財の復旧

種別	被災件数	復旧済	今後の主な復旧見込み
国指定文化財	5	2	・岡城跡(石垣崩壊)令和3年度復旧予定 ・日田市豆田町伝統的建造物保存地区(外壁崩落) 他の老朽箇所とあわせて令和6年度までに復旧予定 ・耶馬溪清水瀑園の景(木橋等損壊) 玖珠町が再整備を検討中
国登録文化財	0	0	
県指定文化財	4	2	・筏場目鏡橋(全壊流出)復旧不能につき指定解除 ・オダニの車橋(一部欠損)地元有志を中心に調整中
合計	9	4	

IV 社会資本等の復旧・復興

1 道路・河川等の復旧

(1) 応急復旧・本復旧の状況

①道路の復旧 ※工事着手割合 93.7% ※本復旧済割合 34.2%

市町村名	事業箇所数	応急復旧	本復旧		
			査定済	工事着手	復旧済
日田市	22	7	22	22	9
由布市	21	8	21	18	1
九重町	14	4	14	13	2
玖珠町	8	1	8	8	5
その他	14	5	14	13	10
合計	79	25	79	74	27

②河川の復旧 ※工事着手割合 91.1% ※本復旧済割合 30.0%

市町村名	事業箇所数	応急復旧	本復旧		
			査定済	工事着手	復旧済
日田市	79	10	79	73	35
由布市	53	1	53	36	3
九重町	117	9	117	102	10
玖珠町	37	3	37	36	14
その他	154	3	154	154	70
合計	440	26	440	401	132

※改良復旧事業(関連区間)2箇所を除く

(改良復旧事業等の実施)

- ・玖珠川(山ノ釣工区):改良復旧事業として採択(R3.1.28)を受け、法面工と護岸工を施工中
 事業名: 河川災害関連事業
 事業費: 2,000百万円
 事業期間: 令和2~4年度
 事業内容: 河床掘削工110,000m²、護岸工11,000m²、法面工15,000m²
- ・玖珠川(湯ノ釣工区):改良復旧事業として採択(R3.1.28)を受け、用地取得推進中
 JR近接を除く護岸工を施工中
 事業名: 河川災害関連事業
 事業費: 500百万円
 事業期間: 令和2~4年度
 事業内容: 護岸工3,000m²
- ・野上川:河川改修事業として令和3年度より新規事業化
 事業名: 広域河川改修事業
 事業費: 6,370百万円
 事業期間: 令和3年度~
 事業内容: 河床掘削工90,000m²、築堤工3,500m³、護岸工14,000m²
 橋梁改築(道路橋3橋、鉄道橋2橋)、堰改築(1基)、用地補償等

- ・ 玖珠川(天ヶ瀬温泉街):昨年度より検討を進めてきた玖珠川の河川改修計画案について6月26日(土)、27日(日)の2日間で説明会を開催。この説明会で頂いた主なご意見・ご要望に対する対応方針について、9月19日～27日にかけて地区毎の説明会を開催した上で、来年度の新規事業化に向けた設計に着手。

③砂防関係施設の復旧、土砂災害の防止 ※工事着手割合 86.2% ※本復旧済割合 30.1%

市町村名	事業箇所数	応急復旧	本復旧		
			査定済	工事着手	復旧済
日田市	34	1	34	34	11
由布市	20	5	20	11	2
九重町	35	11	35	27	6
玖珠町	10	2	10	10	5
その他	24	0	24	24	13
合計	123	19	123	106	37

※改良復旧事業(関連区間)1箇所を除く

(改良復旧事業の実施)

- ・ 花合野川(由布市):改良復旧事業として採択(R3.3.3)を受け、床固工や護岸工を施工中
 事業名： 砂防災関連事業(R3.3.3.採択)
 事業費： 2,414百万円
 事業期間： 令和2～5年度
 事業内容： 護岸工10,639㎡、床固工9基、橋梁1基、堰1基

(災害関連緊急事業の実施)

- ・ 下記6か所について、災害関連緊急事業に着手し、工事を施工中

○宮田川(R2.8.18採択)・・・主堤工完了、垂直壁施工中

- 事業名： 災害関連緊急砂防事業
- 事業費： 283百万円
- 事業期間： 令和2～3年度
- 事業内容： 堰堤工 1基

○貫見川(R2.8.20採択)・・・主堤工(コンクリート打設)施工中

- 事業名： 災害関連緊急砂防事業
- 事業費： 210百万円
- 事業期間： 令和2～3年度
- 事業内容： 堰堤工 1基

○上谷川(R2.8.18採択)・・・主堤工(床堀)施工中

- 事業名： 災害関連緊急砂防事業
- 事業費： 296百万円
- 事業期間： 令和2～3年度
- 事業内容： 堰堤工 1基

○苅屋地区(R2.9.4採択)・・・集水ボーリング完了、鋼管杭施工中

- 事業名： 災害関連緊急地すべり対策事業
- 事業費： 100百万円
- 事業期間： 令和2～3年度
- 事業内容： 鋼管杭工 1式

○柏野地区(R2.9.4採択)・・・集水ボーリングや集水井、鋼管杭施工中

- 事業名： 災害関連緊急地すべり対策事業
- 事業費： 330百万円
- 事業期間： 令和2～3年度
- 事業内容： 集水井工 1式、鋼管杭工 1式

○杉河内地区(R2.8.20採択)・・・斜面掘削・法面整形施工中

事業名： 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業

事業費： 270百万円

事業期間： 令和2～3年度

事業内容： 法面工 1式

(2)道路・河川等公共土木施設と農地の災害復旧工事に係る事前協議と調整

・完了(玖珠川、花合野川等)

(3)砂防関係施設と治山施設の復旧工事に係る事前協議と調整

・完了(金山川、上谷川、上田北地区等)

(4)県による施工支援

①市町復旧事業の受託

市町村名	受託箇所	関連する県の施設	実施状況
日田市	湯ノ釣(ゆのつる)2号線	玖珠川	災害査定完了 令和3年3月に基本協定締結済 令和4年度に実施協定締結予定
九重町	宝泉寺栗原(ほうせんじくりばる)線	宝泉寺川	災害査定完了 詳細設計完了 査定の保留解除に向け協議中 令和3年7月に基本協定締結済 令和4年3月に実施協定締結、 工事発注予定

②(公財)大分県建設技術センターによる施工支援

市町村名	受託箇所	関連する県の施設	実施状況
日田市	湯山(ゆやま)線【新天瀬橋】	玖珠川	災害査定完了 本復旧に向けた詳細設計を実施中
日田市	片山徳瀬(かたやまとくせ)線【徳瀬橋】	庄手(しょうで)川	災害査定完了 本復旧に向けた詳細設計完了 下部工工事発注予定
由布市	向原野田(むかいはのはるのだ)線【黒川橋】	黒川	災害査定完了 本復旧に向けた詳細設計完了 査定の保留解除に向け協議中
玖珠町	下泊里(しもづまり)線【下泊里橋】	玖珠川	災害査定完了 仮橋工事完了 下部工工事実施中

(5)入札制度の弾力的な運用

○被災した土木事務所が発注する公共土木施設災害復旧事業及び災害に関連する事業を対象とした特例措置(令和2年7月)(※農林関係発注工事も同様)

・配置予定技術者

・専任主任技術者及び専任監理技術者の雇用条件の緩和
現行:3か月以上→特例:契約前日までの雇用
(令和2年8月3日以降入札公告又は指名通知を行う工事)

・総合評価落札方式

・総合評価落札方式の要件緩和
予定価格5千万円以上でも適用除外
予定価格1億円以上には施工実績等評価タイプを適用可能
(令和2年8月3日以降入札公告を行う工事)

・現場代理人

・市町発注の災害復旧工事について、近接した県発注工事の施工業者と随意契約を行う場合は兼務可能
(令和2年7月28日以降協議が整った工事)
・県発注の災害復旧工事について、兼務できる工事を従来の2件から3件に拡大
(令和3年2月1日以降工事中又は入札公告等を行う工事)

2 農地・農業用施設等の復旧

(1) 応急復旧・本復旧の状況

① 市町による復旧事業(県の支援)

※工事着手割合 61.7% ※本復旧済割合 24.5%

市町村名	事業箇所数	応急復旧	本復旧		
			査定済	工事着手	復旧済
日田市	100		100	97	11
由布市	1,072	24	1,072	660	219
九重町	438		438	75	12
玖珠町	220	2	220	97	41
その他	575	6	575	554	306
合計	2,405	32	2,405	1,483	589

・全箇所令和2年12月に査定完了、工事着手1,483箇所、本復旧589箇所、残りの箇所も随時発注予定

② 小災害の復旧

・農地等小災害復旧事業債の活用(起債同意数)

市町村名	事業箇所数	活用箇所数		
		農地	農業用施設	林道
日田市	135	50	85	0
由布市	190	98	92	0
九重町	109	60	46	3
玖珠町	46	28	17	1
その他	200	73	80	47
合計	680	309	320	51

(2) 道路・河川等公共土木施設と農地の災害復旧工事に係る事前協議と調整(再掲)

・完了(玖珠川、花合野川等)

3 ため池の復旧

※工事着手割合 95.7% ※本復旧済割合 82.6%

事業名	事業箇所数	応急復旧	本復旧		
			査定済	工事着手	復旧済
災害復旧	6		6	6	6
その他	17	3		16	13
合計	23	3	6	22	19

・災害復旧事業の6箇所について令和2年12月に査定完了、全箇所ですべて工事完了済
 ・その他事業の17箇所では、16箇所ですべて工事着手済、その内13箇所は本復旧完了、未着手の1箇所については令和4年度に廃止工事の着工予定

4 治山施設・林道等の復旧

(1) 治山施設等の復旧

○治山施設の復旧(国庫補助災害復旧事業) ※災害により被害が生じた治山ダム等の施設を復旧

※工事着手割合 60.0% ※本復旧済割合 0.0%

市町村名	事業箇所数	応急復旧	本復旧		
			査定済	工事着手	復旧済
由布市	3		3	1	
九重町	2		2	2	
合計	5	0	5	3	0

・工事着手3箇所。残り2箇所については、再入札準備中。

○林地崩壊の復旧 ※災害で新たに発生した荒廃山地で堤体等を整備(災害関連緊急治山事業)

※工事着手割合 78.6% ※本復旧済割合 28.6%

市町村名	事業箇所数	応急復旧	本復旧		
			決定済	工事着手	復旧済
日田市	6		6	4	2
由布市	1		1	1	
九重町	4		4	3	1
その他	3		3	3	1
合計	14	0	14	11	4

・工事着手11箇所。うち、4箇所で復旧完了。残り3箇所については、入札準備中。

○県単治山事業 ※国の災害復旧の対象とならなかった治山施設の崩土除去等

※工事着手割合 96.9% ※本復旧済割合 90.6%

市町村名	事業箇所数	応急復旧	本復旧	
			工事着手	復旧済
日田市	9	1	8	8
由布市	11		11	10
九重町	2	1	2	1
玖珠町	1		1	1
その他	9		9	9
合計	32	2	31	29

・工事着手31箇所。うち29箇所で復旧完了。残り1箇所については、災害復旧工事と合算して発注予定。

(2) 砂防関係施設と治山施設の復旧工事に係る事前協議と調整(再掲)

・完了(金山川、上谷川、上田北地区等)

(3) 林道等の復旧

①林道 ※工事着手割合 95.9% ※本復旧済割合 36.7%

市町村名	事業箇所数	応急復旧	本復旧		
			査定済	工事着手	復旧済
日田市	32	1	32	31	6
由布市	5	1	5	5	5
九重町	3	0	3	3	2
玖珠町	5	0	5	4	4
その他	4	0	4	4	1
合計	49	2	49	47	18

- ・令和2年10月12日から12月11日にかけて災害査定を実施
- ・工事着手準備の整った箇所から工事に着手

(うち主な復旧箇所)

市町村名	路線名	場 所	本復旧完了日
日田市	曾家中西線	日田市前津江町赤石	令和4年3月予定
九重町	山浦線	九重町大字菅原	令和3年4月
玖珠町	山浦線	玖珠町大字山浦	令和3年7月

②森林作業道

市町村名	事業箇所数	工事着手	本復旧済
日田市	17	6	1
その他	2	2	2
合計	19	8	3

※本復旧済割合 15.8%

- ・工事着手は、被災現地までの林道等が復旧した後

(4) 災害に強い森林づくり

河川や溪流沿いの人工林において、伐採により広葉樹の自然植生を回復する事業を実施中

市町村名	R2事業箇所数	R3事業箇所数	R4事業箇所数
日田市	3	1	
その他	7	6	
合計	10	7	0

(5) 流木対策の推進

- ・流木捕捉効果の高いスリットダムを新設(阿蘇野地区(由布市)1基令和4年完了予定)
- ・河川や溪流沿いの人工林を伐採し、広葉樹での回復を図ることで流木の発生を抑制

5 その他施設の復旧

(1)くじゅう連山

○多大な被害が生じた長者原すがもり登山道、沢水朽網分れ登山道、赤川登山道は、令和3年12月に復旧工事が完了予定である。登山者にとって優先度の高い箇所から重点的に着手した結果、現状においても安全に利用できる状況となっている。

【復旧スケジュール】

	令和2年度									令和3年度								
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
被災状況の調査	→																	
関係者等との協議・意見調整		→	→	→	→	→	→	→	→									
ボランティアによる復旧活動		→	→	→	→	→	→	→	→									
設計等				→	→	→	→	→	→									
復旧工事の実施										→	→	→	→	→	→	→	→	→

【優先度の高いものから実施】
長者原すがもり登山道・赤川登山道復旧工事、
沢水朽網分れ登山道復旧工事完了予定

(2)漂着物・漂流物の撤去

①災害時海岸漂着物処理事業

航行に支障が生じないよう、港湾や漁港内の流木等の撤去

○港湾区域内漂着物 完了

市町村名	被害港湾数	うち撤去済
大分市	1	1

○漁港区域内漂着物 完了

市町村名	被害漁港数	うち撤去済
別府市	1	1
大分市	1	1
津久見市	1	1
合計	3	3

○海岸漂着物 完了

市町村名	被害海岸数	うち撤去済
国東市	3	3
杵築市	2	2
日出町	1	1
別府市	1	1
大分市	1	1
佐伯市	2	2
合計	10	10

②清掃船「清海」による漂流物回収

船舶航行の支障となる漂流物を回収済

回収量:ごみ526m³ 流木644本

6 JRの復旧

(1) 被災・復旧状況と全線復旧に向けた対応

路線名	復旧状況	全線復旧に向けた対応状況
久大本線	[日田駅～豊後森駅間] 令和2年8月8日運転再開	令和3年3月1日から全線で運転再開済
	[庄内駅～向之原駅間] 令和2年8月29日運転再開	
	[由布院駅～庄内駅間] 令和3年2月13日運転再開	

※第一、第二野上川橋梁：JR九州による全線開通後、浸水被害軽減に向け、令和3年度からの河川改修事業化を予定

※久大本線 主な被災箇所

第一野上川橋梁橋脚傾斜

※1929年完成、長さ：52.88
(R3.3.1復旧済み)



第二野上川橋梁流失

※1928年完成、長さ：39.92m
(R3.3.1復旧済み)



水分トンネル土砂流入

(R3.3.1復旧済み)



第八玖珠川橋梁盛土流出

(R2.8.8復旧済み)




南由布・湯平間築堤崩壊

(R3.2.13復旧済み)



馬地谷橋梁流失

(R2.8.29復旧済み)

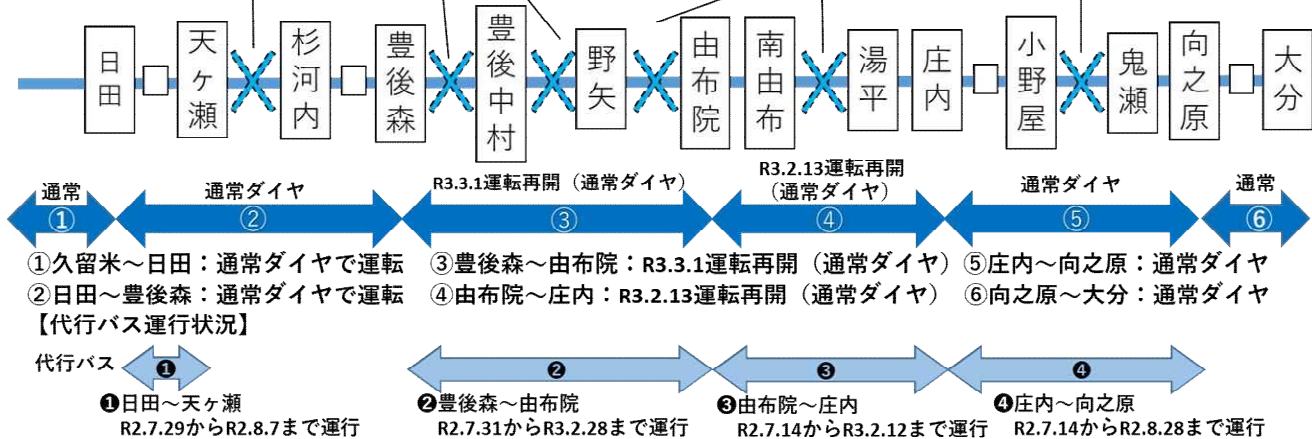

V 復旧・復興に係る人的・財政支援

1 人的支援

(1) 発災初期における県職員等の派遣(7月7日～8月6日)

<県職員>

業務内容	支援場所	職種	延応援人数(人日)				
			日田市	由布市	九重町	玖珠町	計
避難者の健康支援	避難所、被災者の住宅等	保健師	12	8	40	6	66
産廃仮置場現況確認、避難所の衛生指導、ペット対応等	避難所、産廃仮置場等	獣医師 薬剤師 化学	20	7	21	3	51
医療ニーズ・保健衛生状況把握のためのリエゾン派遣	市役所、町役場	保健師 事務	11	14	17	5	47
家屋危険度調査	被災箇所	建築	-	6	-	-	6
住宅関係住民相談窓口業務	町役場	建築	-	-	7	-	7
援農隊	被災箇所	農業等	-	-	6	-	6
計			43	35	91	14	183

<県内市町村職員>

業務内容	派遣市町村	職種	延応援人数(人日)				
			日田市	由布市	九重町	玖珠町	計
健康状態の把握、健康相談等のため被災者の家庭訪問を実施	別府市、佐伯市、津久見市、豊後大野市、臼杵市、宇佐市、大分市	保健師	14	-	-	-	14
計			14	0	0	0	14

(2) 復旧工事に係る県職員等の派遣

<県職員>

職種	業務内容	日田市		由布市		九重町		玖珠町	
		応援期間	延応援人数(人日)	応援期間	延応援人数(人日)	応援期間	延応援人数(人日)	応援期間	延応援人数(人日)
農業土木	工法決定等の技術支援、査定設計書の作成支援・積算支援・チェック、査定現地支援、朱入れ設計書の作成支援、発注設計書作成支援	R2.9.1 ～ R2.10.23	36	R2.9.1 ～ R2.12.11	290	R2.9.1 ～ R2.12.18	235	R2.9.1 ～ R2.12.18	124
林業		R2.9.1 ～ R2.12.11	58	-	-	-	-	-	-
土木		R2.8.17 ～ R2.10.30	80	-	-	R2.8.3 ～ R2.12.7	86	-	-
計			174		290		321		124

<県内市町村職員>

職 種	業 務 内 容	日 田 市		由 布 市		九 重 町		玖 珠 町	
		応援期間	延応援 人数 (人日)	応援期間	延応援 人数 (人日)	応援期間	延応援 人数 (人日)	応援期間	延応援 人数 (人日)
農業土木	工法決定等の技術支援、査定設計書の作成支援・積算支援・チェック、査定現地支援、朱入れ設計書の作成支援、発注設計書作成支援	-	-	R2.11.9 ～ R2.12.25	102	R2.11.9 ～ R2.12.25	53	-	-
土 木		R2.8.17 ～ R2.11.27	313	-	-	R2.8.17 ～ R2.12.25	288	-	-
計			313		102		341		0

(3)九州・山口9県災害時応援協定等に基づく他県職員等の受入れ(今後見込み)

<他県職員>

職 種	受入予定期間	受入予定所属及び人数			
		中部振興局	西部振興局	日田土木事務所	計
農業土木	R2.9.15～R2.9.22		2	-	2
	R2.9.23～R2.11.30	2	2	-	4
林 業	R2.10.1～R3.3.31	-	1	-	1
土 木	R2.9.23～R2.9.30	-	-	2	2
	R2.10.1～R2.12.31	-	-	3	3
	R3.1.1～R3.3.31	-	-	4	4
	R3.4.1～R4.3.31	-	-	1	1

<県外市町村職員>

職 種	受入期間	受入市及び人数
		日田市
土 木	R2.10.12～R2.11.27	1

2 財政支援

(1) 激甚災害の指定による国庫補助率の嵩上げ

施設区分	一般災害	激甚災害
公共土木施設等	70%	83%
農地	85.1%	96.5%
農業用施設	94.9%	99.3%
林道	82.1%	94.6%

(2) 普通交付税の繰上げ交付(7月14日交付)

日田市	13億69百万円
由布市	6億65百万円
九重町	2億93百万円
玖珠町	3億57百万円
計	26億84百万円

(3) 地方財政措置への要望

- ・令和2年7月16日、20日、22日、8月26日、11月10～11日 国に対し被災市町への支援を要望
(九州知事会要望含む)
- ・令和3年2月8日 国に対し特別交付税の被災市町への配慮を要望
(主な被災団体における令和2年度特別交付税交付状況)

市町村名	交付額	対前年伸び率
日田市	1,940,139 千円	25.9 %
由布市	770,733 千円	61.3 %
九重町	465,487 千円	101.1 %
玖珠町	374,494 千円	29.6 %

VI 各事業所管部局と進捗管理

1 事業所管部局

項目	担当部局	担当課室・班(連絡先)	
I 被災者への支援	1 医療救護活動・保健衛生活動等		
	(1)医療救護活動	福祉保健部 医療政策課 政策医療班(097-506-2659)	
	(2)保健衛生活動	福祉保健部 福祉保健企画課 地域保健・総務班(097-506-2624)	
	(3)精神保健活動	福祉保健部 障害福祉課 精神保健福祉班(097-506-2727)	
	(4)子どもの心のケア	福祉保健部 こども・家庭支援課 こども育成支援班(097-506-2707)	
	(5)犯罪防止活動	警察本部 生活安全企画課(097-536-2131)	
	2 暮らし・住宅再建の支援		
	(1)災害ボランティア等による支援	生活環境部 県民生活・男女共同参画課(097-534-2052)	
	(2)災害廃棄物処理	生活環境部 循環社会推進課 資源化推進班(097-506-3126)	
	(3)罹災証明の発行	防災局 防災対策企画課 防災企画班(097-506-3067)	
	(4)みなし仮設住宅及び公的賃貸住宅への被災者の受入状況	福祉保健部 福祉保健企画課 地域福祉班(097-506-2622)	
	(5)水道施設の復旧	土木建設部 公営住宅室 住宅管理班(097-506-4684)	
	(6)義援金等の募集・配分・義援金寄付金	生活環境部 環境保全課 水環境班(097-506-3117)	
		福祉保健部 福祉保健企画課 地域福祉班(097-506-2622)	
		総務部 財政課 総務企画班(097-506-2355)	
	3 弔慰金・資金等による支援		
	(1)災害弔慰金の支給	福祉保健部 福祉保健企画課 地域福祉班(097-506-2622)	
	(2)災害援護資金の貸付	福祉保健部 福祉保健企画課 地域福祉班(097-506-2622)	
	(3)生活福祉資金の貸付	福祉保健部 福祉保健企画課 地域福祉班(097-506-2622)	
	(4)被災者生活再建支援金の支給(国)	防災局 防災対策企画課 防災企画班(097-506-3067)	
	(5)災害被災者住宅再建支援金の支給(県)	防災局 防災対策企画課 防災企画班(097-506-3067)	
	(6)県税の減免等	総務部 税務課 課税班(097-506-2384)	
	(7)県使用料・手数料の免除	総務部 財政課 総務企画班(097-506-2355)	
	II 農林水産業・商工観光業への支援	1 農林水産業の再建	
		(1)農業者への支援	農林水産部 農林水産企画課 企画管理班(097-506-3518)
①相談窓口を県振興局に設置		地域農業振興課 普及・研究班(097-506-3572)	
②金融支援等		農林水産部 団体指導・金融課 金融班(097-506-3613)	
③各種助成等 : ハウス等		農林水産部 園芸振興課 園芸企画班(097-506-3576)	
土壌改良等		農林水産部 地域農業振興課 地域農業班(097-506-3663)	
果樹・茶改植等		農林水産部 水田畑地化・集落営農課 水田活用推進班(097-506-3576)	
果樹園地		農林水産部 園芸振興課 園芸企画班(097-506-3576)	
畜産農家		農林水産部 水田畑地化・集落営農課 集落営農班(097-506-3596)	
④鳥獣被害防止施設の復旧支援		農林水産部 園芸振興課 果樹・花き特用班(097-506-3656)	
(2)林業者への支援		農林水産部 地域農業振興課 地域農業班(097-506-3663)	
①相談窓口を県振興局に設置		農林水産部 園芸振興課 果樹・花き特用班(097-506-3656)	
②金融支援等		農林水産部 地域農業振興課 地域農業班(097-506-3663)	
③各種助成等 : 木材加工流通施設等		農林水産部 園芸振興課 畜産技術室 生産振興班(097-506-3682)	
しいたけ生産施設		農林水産部 畜産技術室 酪農・飼料班(097-506-3684)	
(3)水産業者への支援		農林水産部 森との共生推進室 森林環境保護班(097-506-3876)	
①相談窓口を県振興局に設置		農林水産部 農林水産企画課 企画管理班(097-506-3518)	
②金融支援等		農林水産部 林務管理課 森林・林業企画班(097-506-3820)	
③各種助成等 : 内水圏養殖施設等		農林水産部 団体指導・金融課 金融班(097-506-3613)	
中小企業・小規模事業者の再建		農林水産部 水産振興課 振興班(097-506-3953)	
(1)相談窓口を経営創造・金融課内に設置		商工観光労働部 経営創造・金融課 金融・再生支援班(097-506-3226)	
(2)施設等の復旧支援		商工観光労働部 商工観光労働企画課 企画管理班(097-506-3215)	
(3)金融支援		商工観光労働部 経営創造・金融課 金融・再生支援班(097-506-3226)	
観光業の再建		商工観光労働部 観光政策課 観光産業振興班(097-506-2116)	
III 教育施設・文化財等の復旧・復興		1 学校施設・教育の復旧・復興	
	(1)学校施設の復旧等 : 公立	教育庁 教育財務課 施設管理班(097-506-5457)	
	私立	生活環境部 私立振興・青少年課 私立振興班(097-506-3073)	
	(2)被災した児童・生徒への対応 : 心のケア	教育庁 学校安全・安心支援課 いじめ・不登校対策班(097-506-5547)	
	通学用の臨時バスの運行	教育庁 高校教育課 管理予算班(097-506-5601)	
	2 社会教育施設・文化財の復旧		
	(1)社会教育施設の復旧	教育庁 社会教育課 管理予算班(097-506-5521)	
	(2)文化財の復旧	教育庁 文化課 文化財班(097-506-5498)	
	IV 社会資本等の復旧・復興	1 道路・河川等の復旧	
		(1)応急復旧・本復旧の状況 : 道路	土木建設部 道路保全課 防災・保全班(097-506-4584)
: 河川		土木建設部 河川課 防災班(097-506-4596)	
: 砂防		土木建設部 砂防課 砂防施設整備班(097-506-4636)	
(2)公共土木施設と農地の復旧の協議・調整		土木建設部 道路保全課 防災・保全班(097-506-4584)	
(3)砂防関係と治山施設の復旧の協議・調整		土木建設部 河川課 防災班(097-506-4596)	
(4)県による施工支援		土木建設部 砂防課 砂防施設整備班(097-506-4636)	
(5)入札制度の弾力的な運用		土木建設部 建設政策課 企画・アセットマネジメント推進班(097-506-4555)	
土木建設部 公共工事入札管理室(097-506-4527)			
農林水産部 工事技術管理室(097-506-3533)			
2 農地・農業用施設等の復旧			
(1)応急復旧・本復旧の状況		農林水産部 農村基盤整備課 防災班(097-506-3725)	
(2)復旧にあわせた産地強化に向けた取組		農林水産部 市町村振興課 財政班(097-506-2415)	
(3)公共土木施設と農地の復旧の協議・調整		農林水産部 水田畑地化・集落営農課 集落営農班(097-506-3596)	
ため池の復旧		農林水産部 農村基盤整備課 防災班(097-506-3725)	
農林水産部 農村基盤整備課 防災班(097-506-3725)			
4 治山施設・林道等の復旧			
(1)治山施設等の復旧		農林水産部 森林保全課 治山班(097-506-3866)	
(2)砂防関係と治山施設の復旧の協議・調整		農林水産部 森林保全課 治山班(097-506-3866)	
(3)林道等の復旧		農林水産部 林務管理課 林道班(097-506-3819)	
(4)災害に強い森林づくり		農林水産部 森林整備室 造林・間伐班(097-506-3882)	
(5)流木対策の推進		農林水産部 森林整備室 造林・間伐班(097-506-3882)	
農林水産部 森林保全課 治山班(097-506-3866)			
森林整備室 造林・間伐班(097-506-3882)			
5 その他施設の復旧			
(1)くじゅう連山	生活環境部 自然保護推進室 自然保護班(097-506-3022)		
(2)漂着物・漂流物の撤去 : 港湾	土木建設部 港湾課 港湾環境班(097-506-4615)		
: 漁港	農林水産部 漁港漁村整備課 企画調査班(097-506-3977)		
: 海岸	土木建設部 河川課 ダム・海岸班(097-506-4595)		
: 清掃船による回収	生活環境部 循環社会推進課 資源化推進班(097-506-3126)		
6 JRの復旧			
(1)被災・復旧状況と全線復旧に向けた対応	企画振興部 交通政策課 地域交通班(097-506-2153)		
V 復旧・復興に係る人的・財政支援	1 人的支援		
	(1)発災初期における県職員等の派遣	総務部 人事課 人事班(097-506-2305)	
	(2)復旧工事に係る県職員等の派遣	総務部 市町村振興課 行政班(097-506-2409)	
	(3)九州・山口9県災害時応援協定等	総務部 行政企画課 地方主権推進班(097-506-2482)	
	2 財政支援		
	(1)激甚指定による国庫補助率の嵩上げ	防災局 防災対策企画課 防災企画班(097-506-3067)	
	(2)普通交付税の繰上げ交付	総務部 市町村振興課 財政班(097-506-2418)	
	(3)地方財政措置への要望	総務部 財政課 総務企画班(097-506-2355)	
	企画振興部 市町村振興課 財政班(097-506-2415)		
	企画振興部 政策企画課 政策企画班(097-506-2031)		
VI 推進計画の進捗管理	企画振興部 政策企画課 政策企画班(097-506-2031)		
	防災局 防災対策企画課 防災企画班(097-506-3067)		
参考 被害状況			

2 進捗管理

○大分県災害対策会議の開催状況

- 第1回 令和2年7月16日
- 第2回 令和2年7月27日
- 第3回 令和2年7月31日
- 第4回 令和2年8月3日
- 第5回 令和2年8月27日
- 第6回 令和2年11月9日
- 第7回 令和3年2月16日
- 第8回 令和3年6月1日

○現地対策会議の開催状況

(日田市、由布市、九重町、玖珠町で開催)

- 第1回 令和2年7月17日
- 第2回 令和2年8月7日

<参考:これまでの経緯>

○豪雨災害

令和2年7月6日からの記録的な豪雨で、日田市、由布市、九重町、玖珠町を中心に、県内各所で甚大な被害が発生

○ 7月 6日 県災害対策本部の設置

○ 同日 災害救助法の適用

・適用市町:日田市、由布市、九重町、玖珠町

○ 7月7日～10日 災害派遣要請

・自衛隊(日田市、由布市)

○ 7月13日 孤立地域が全て解消

○ 7月14日 普通交付税の繰上げ交付

○ 7月16日 第1回 災害対策会議

・被害状況等

○ 同日 武田防災担当大臣へ緊急要望(現地視察にて)

- ・激甚災害の早期指定
- ・被災者の生活再建への支援
- ・早期の復旧・復興と国土強靱化の推進
- ・JR久大本線の早期復旧に向けた支援
- ・観光産業への支援
- ・商工業、農林業への支援
- ・教育・文化財の復旧支援
- ・復旧・復興に向けての財政支援

○ 7月17日 第1回 現地災害対策会議(日田市、由布市、九重町、玖珠町)

・今後の復旧・復興に向けた取組等

- 7月20日 江藤農林水産大臣へ緊急要望(web会議にて)
 - ・激甚災害の早期指定
 - ・災害査定の早期実施と災害復旧事業の推進
 - ・農林水産業者の生産活動継続への支援
 - ・農林水産業関係施設及び生産現場の早期復旧
 - ・災害に強い農林水産業の推進
- 7月22日 梶山経済産業大臣へ緊急要望(現地視察にて)
 - ・激甚災害の早期指定
 - ・商工業への支援
 - ・観光産業への支援
 - ・復旧・復興に向けての財政支援
- 同日 全国知事会から安倍内閣総理大臣へ緊急要望
 - ・豪雨災害への対応及び被災者再建支援の充実強化
- 7月27日 第2回 災害対策会議
 - ・被害状況(被害額など)等
- 7月28日 災害関係補正予算(専決処分)(10億3千万円)
 - ・災害援護資金貸付金、民営水道施設災害復旧支援事業等
- 7月31日 第3回 災害対策会議
 - ・被災者の生活の生業(なりわい)の再建に向けた対策パッケージ(国)等
- 8月 3日 第4回 災害対策会議
 - ・当面の対応方針(市町別)等
- 8月 7日 第2回 現地災害対策会議(日田市、由布市、九重町、玖珠町)
 - ・復旧・復興方針等
- 8月17日 国道210号の通行止めが県内全区間で解消
- 8月25日 激甚災害指定(本激)の閣議決定(8月28日公布・施行)
- 8月26日 赤羽国土交通大臣へ緊急要望(現地視察にて)
 - ・早期の復旧・復興と国土強靱化の推進
 - ・JR久大本線の早期復旧に向けた支援
 - ・観光産業への支援
 - ・商工業への支援
 - ・復旧・復興に向けての財政支援
- 8月27日 第5回 災害対策会議
 - ・「復旧・復興推進計画」の決定
- 同日 災害関係補正予算(専決処分)(144億4183万8千円)
 - ・なりわい再建支援事業、観光誘客緊急対策事業等

- 10月17日 国道442号の通行止め解消により、県内で国道の全面通行止めが全て解消
- 11月10日～11日 国の関係省庁へ要望
 - ・早期の復旧・復興と国土強靱化の推進
- 12月11日 事業規模15兆円程度となる「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」の閣議決定
- 12月25日 国の災害査定が全て終了
- 3月 1日 令和3年3月1日の始発列車からJR久大本線が全線で運転再開

参考 被害状況

令和2年7月豪雨に係る被害状況(1/3頁)

令和3年11月12日時点

被害種別		単位	県計	日田市	由布市	九重町	玖珠町	その他	
人的被害	死者	人	6	1	5				
	行方不明	人							
	負傷者	重傷者	人	1				1	
		軽傷者	人	4	2			2	
住家被害	全壊	棟	69	53	6	7	2	1	
	半壊	棟	209	88	17	80	17	7	
	一部損壊	棟	214	68	82	6	23	35	
	床上浸水	棟	129	52	23	1	15	38	
	床下浸水	棟	469	72	136	100		161	
	合計	棟	1,090	333	264	194	57	242	
非住家被害		棟	243	140	38	11	24	30	
住民の孤立	(現時点)	地区数	地区						
		世帯数	世帯						
		人数	人						
	(最大)	地区数	地区	10	10				
		世帯数	世帯	66	66				
		人数	人	158	158				
避難者等の状況	(現時点)	避難所数	箇所						
		世帯数	世帯						
		人数	人						
	(最大)	避難所数	箇所	354	54	13	9	12	266
		世帯数	世帯	969	265	74	102	106	422
		人数	人	1,821	517	171	218	207	708
発令状況等(最大の避難勧告等)	避難準備・高齢者等避難開始	世帯数	世帯	420,635	23,664	15,664	3,916	6,626	370,765
		人数	人	889,767	55,340	34,653	9,237	15,068	775,469
	避難勧告	世帯数	世帯	187,263	11,596	15,664	953	6,643	152,407
		人数	人	387,360	26,453	34,653	2,376	15,016	308,862
	避難指示	世帯数	世帯	30,079	27,555		696		1,828
		人数	人	70,252	64,835		1,697		3,720
	災害発生情報	世帯数	世帯	15,664		15,664			
		人数	人	34,653		34,653			

※1 被害状況の集計は令和2年7月6日から令和3年11月12日まで

※2 「その他」欄：大分市、別府市、中津市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、国東市、姫島村、日出町の計

令和2年7月豪雨に係る被害状況(2/3頁)

令和3年11月12日時点(被害額:百万円)

被害種別			県計	日田市	由布市	九重町	玖珠町	その他		
社会 イン フラ 関係	道路 (橋梁 含む)	国道 (国管理)	箇所 被害額							
		国県道 (県管理)	箇所 被害額	468 4,715	57 1,941	132 975	34 867	20 251	225 681	
		市町村道	箇所 被害額	1,398 5,302	308 2,017	215 604	127 533	34 802	714 1,346	
		計	箇所 被害額	1,866 10,017	365 3,958	347 1,579	161 1,400	54 1,053	939 2,027	
	河川	国管理	箇所 被害額							
		県管理	箇所 被害額	442 18,987	81 5,968	53 2,579	117 4,464	37 2,041	154 3,935	
		市町村管理	箇所 被害額	218 2,628	33 331	6 93	59 1,027	31 403	89 774	
		計	箇所 被害額	660 21,615	114 6,299	59 2,672	176 5,491	68 2,444	243 4,709	
	海岸	箇所 被害額								
	港湾	箇所 被害額								
	砂防設備	箇所 被害額	124 6,064	34 1,556	21 2,649	35 1,138	10 155	24 566		
	都市・公園	箇所 被害額	5 5		1 1		1 2	3 2		
	上水道	箇所 被害額	27 408	9 211	3 83	2 64	10 41	3 9		
	下水道	箇所 被害額	1 100					1 100		
	公営住宅	箇所 被害額	7 49	2 43	2 2	2 3		1 1		
	小計	箇所 被害額	2,690 38,258	524 12,067	433 6,986	376 8,096	143 3,695	1,214 7,414		
	農林 水産 関係	農業関係	農産物等	箇所 被害額	738 244	46 75	269 19	133 66	108 45	182 39
			栽培施設	箇所 被害額	88 414	18 268	17 15	26 87	18 31	9 13
			農地・ 農業用施設	箇所 被害額	5,945 13,616	601 881	2,258 4,902	1,252 3,462	807 1,940	1,027 2,431
			その他 農業施設	箇所 被害額						
計			箇所 被害額	6,771 14,274	665 1,224	2,544 4,936	1,411 3,615	933 2,016	1,218 2,483	

令和2年7月豪雨に係る被害状況(3/3頁)

令和3年11月12日時点(被害額:百万円)

被害種別			県計	日田市	由布市	九重町	玖珠町	その他	
農林水産関係	林業関係	林地崩壊	箇所 被害額	45 1,718	14 499	11 338	5 390	1 5	14 486
		治山施設	箇所 被害額	12 277	1 8	3 136	3 123		5 10
		林道	箇所 被害額	300 1,433	143 890	7 45	44 147	17 48	89 303
		その他 林業施設	箇所 被害額	51 199	19 102	1 1	19 76	9 14	3 6
		計	箇所 被害額	408 3,627	177 1,499	22 520	71 736	27 67	111 805
	漁業関係	水産関係	箇所 被害額	20 152	7 10	3 25	6 111	2 5	2 1
		漁港関係	箇所 被害額	5 182					5 182
		計	箇所 被害額	25 334	7 10	3 25	6 111	2 5	7 183
	小計		箇所 被害額	7,204 18,235	849 2,733	2,569 5,481	1,488 4,462	962 2,088	1,336 3,471
	商工・観光関係		箇所 被害額	186 5,056	96 3,242	36 954	27 350	9 192	18 318
	社会福祉関係		箇所 被害額	8 661	4 649	2 10		1 2	1 1
	教育関係	公立学校	県立学校	箇所 被害額	3 11	1			
市町村立 学校			箇所 被害額	5 83	1 46	1 1	3 36		
計			箇所 被害額	8 94	2 46	1 1	3 36		2 11
私立学校		箇所 被害額	1 7					1 7	
その他学校施設		箇所 被害額							
社会教育施設		箇所 被害額	6 21		4 16		2 5		
文化財		箇所 被害額	9 6	4	1 4		1	3 2	
小計		箇所 被害額	24 128	6 46	6 21	3 36	3 5	6 20	
その他		箇所 被害額	14 275	1 8	2 76	4 77	1 5	6 109	
合計		箇所 被害額	10,126 62,613	1,480 18,745	3,048 13,528	1,898 13,021	1,119 5,987	2,581 11,332	

※ 商工・観光関係の箇所、被害額は、商工団体、市町村など関係者からの聞き取りにより把握した、施設や設備等について被害が見込まれる事業者の数値
