



大分都市計画道路 庄の原佐野線(下郡工区)

事業説明会

次第

- 下郡工区の進捗状況等
- 質疑応答

令和7年4月22日

大分県大分土木事務所

説明する内容

○下郡工区の進捗状況等

1. 事業の進捗状況と今後のスケジュールについて
2. 道路計画及び工事概要について
(令和7年度以降の工事予定箇所・内容)

1.事業の進捗状況と 今後のスケジュールについて



1. 事業の進捗状況と今後のスケジュールについて



	平成29年度 (1年目)	平成30年度 (2年目)	令和元年度 (3年目)	令和2年度 (4年目)	令和3年度 (5年目)	令和4年度 (6年目)	令和5年度 (7年目)	令和6年度 (8年目)	令和7年度 (9年目)	令和8年度 (10年目)	令和9年度
測量業務	道路・橋梁の設計を行うための測量	用地の境界を決めるための測量							現在		
調査業務	橋梁の予備設計を行うための地質調査			橋梁の詳細設計を行うための地質調査							
設計業務		道路・橋梁の予備設計		道路・橋梁などの詳細設計							
文化財調査											
用地買収・補償											
建物調査											
用地補償											
工事											

(工事着手にあたり、現在の騒音や振動等の状況、周辺の建物等の状況を調査します。)

(工事を行うための施工手順や交通処理の検討などを行います。)

みなさまのご協力により用地取得が完了しました。
(用地進捗率：100%【契約面積ベース】)

橋脚の工事に着手しました。


供用開始目標

※今後の進捗状況により変更の可能性があります

2.道路計画及び工事概要について



2. 道路計画及び工事概要について

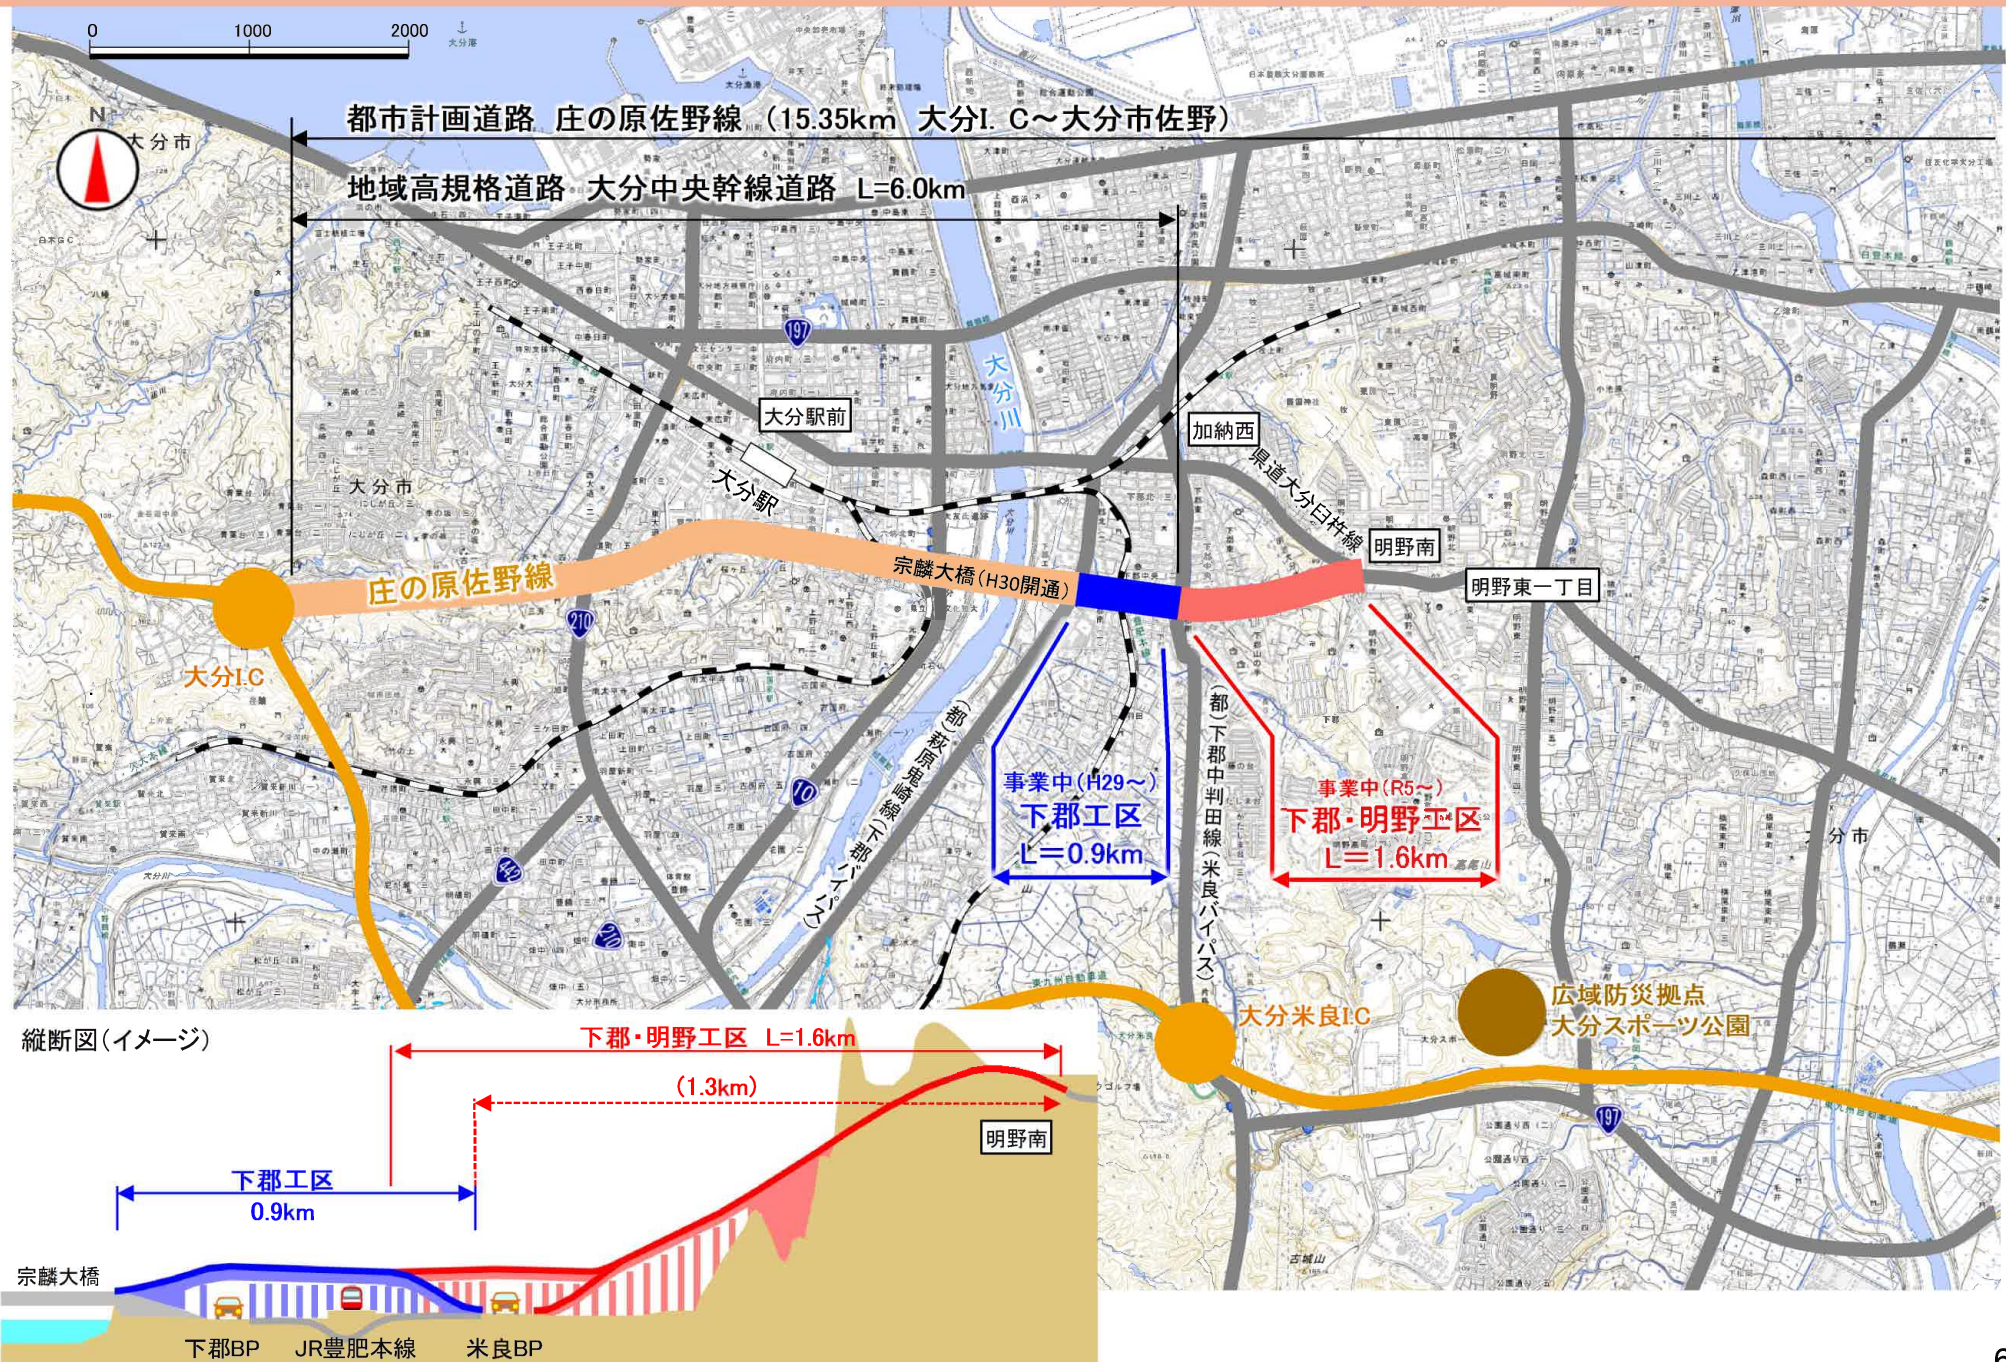


2. 道路計画及び工事概要について

下郡工区～下郡・明野工区完成イメージ




2. 道路計画及び工事概要について

■ 道路計画について

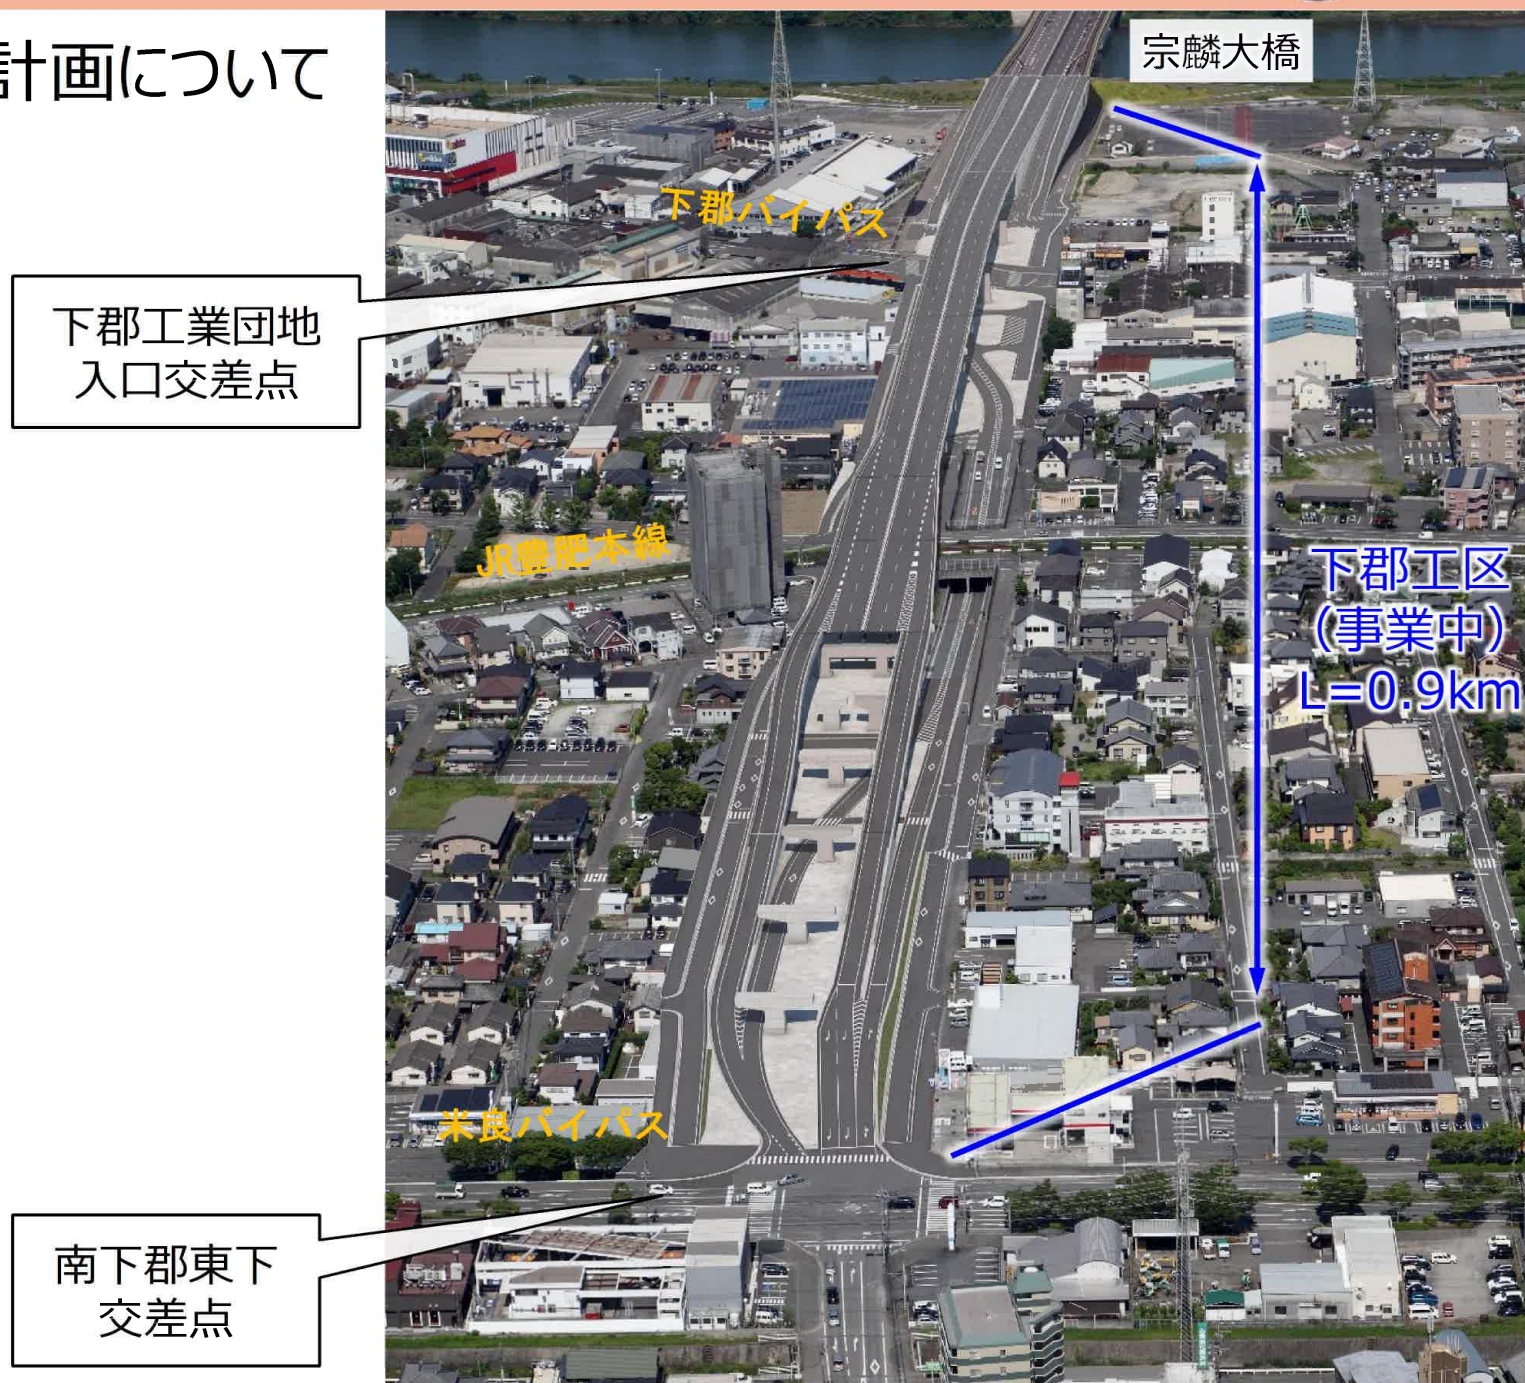


2. 道路計画及び工事概要について

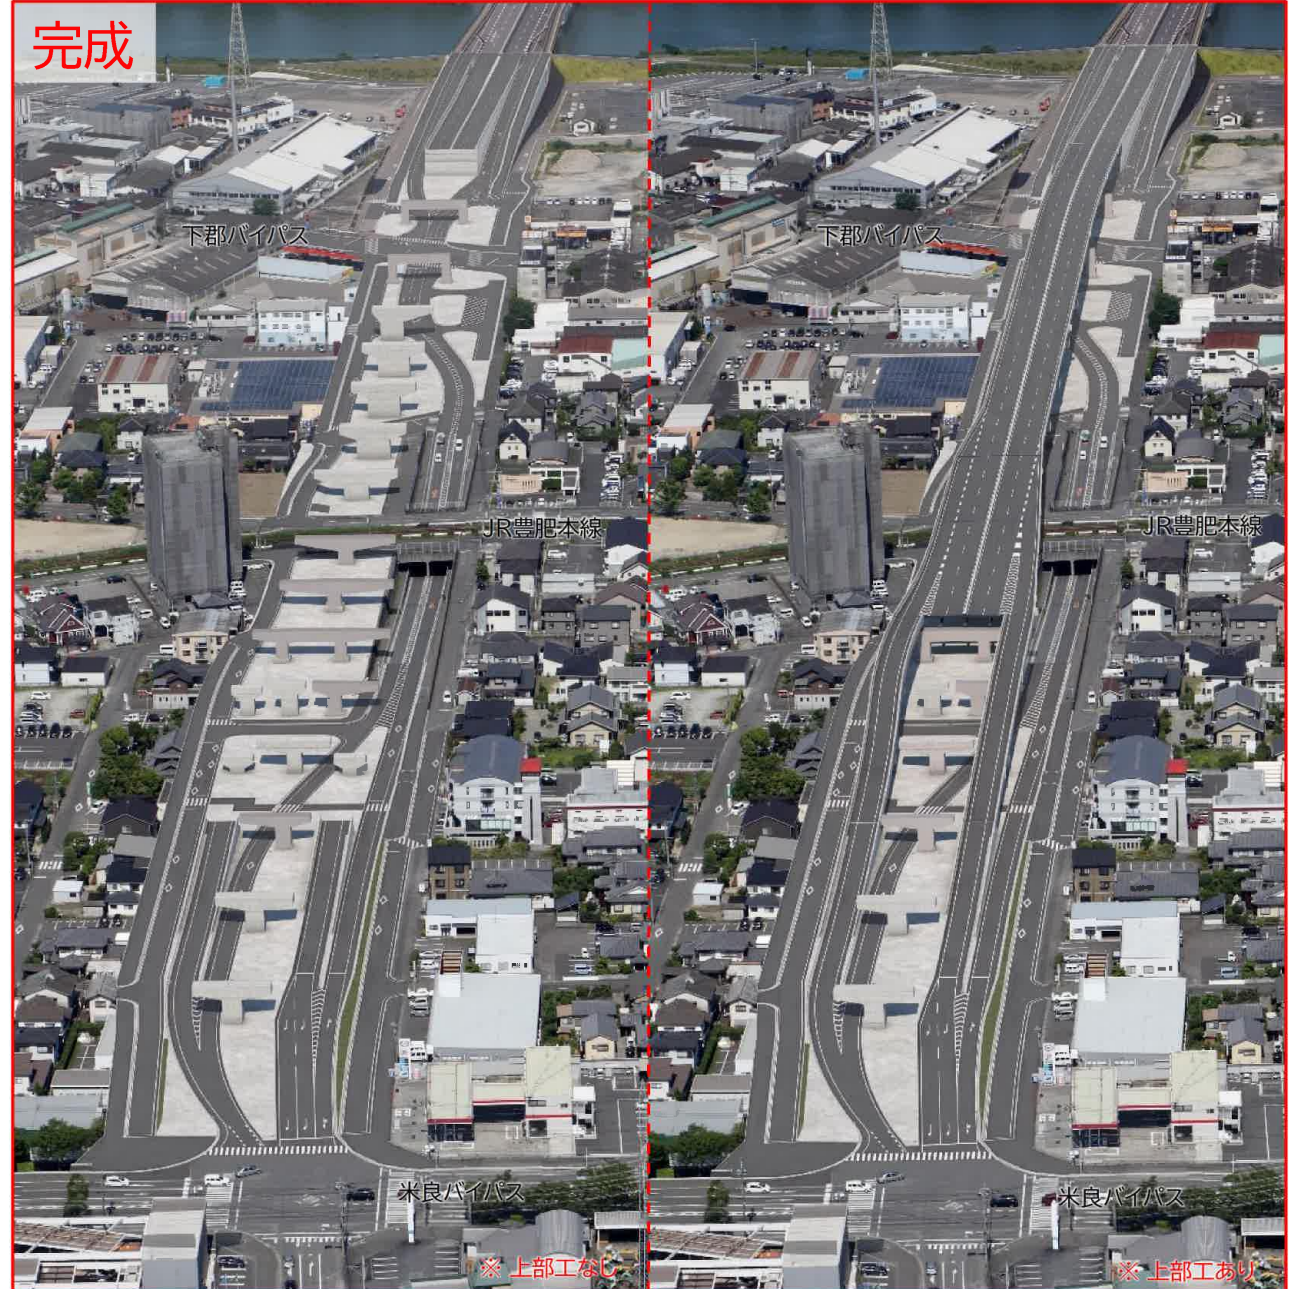

2. 道路計画及び工事概要について

■ 工事計画について

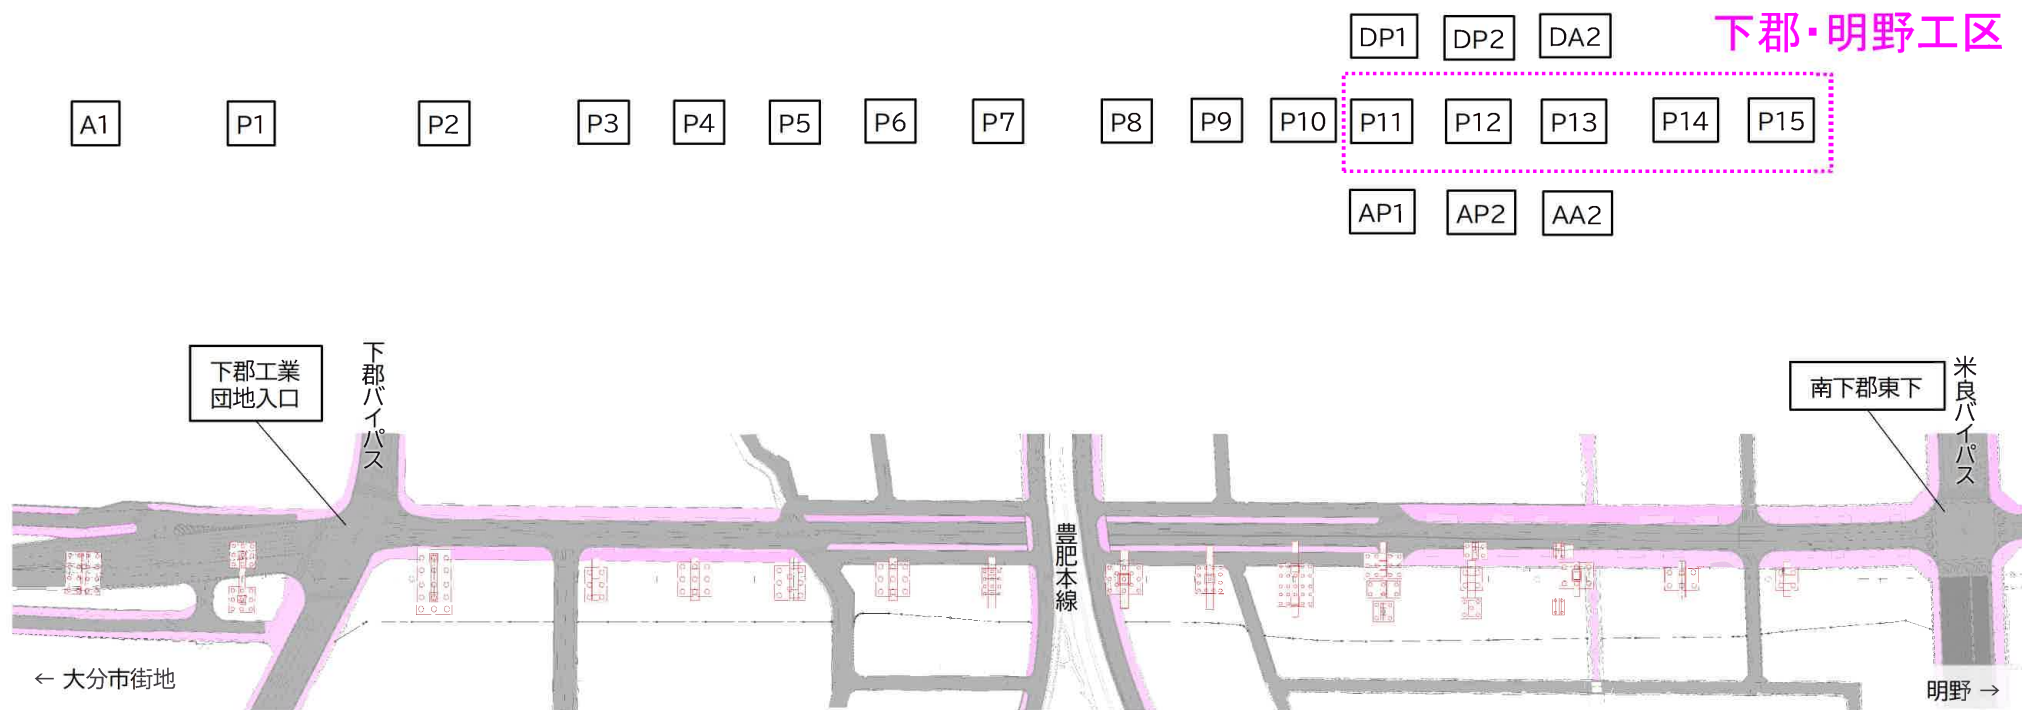


2. 道路計画及び工事概要について

■ 工事計画について

＜令和7年度＞

※今後の進捗状況により変更の可能性があります

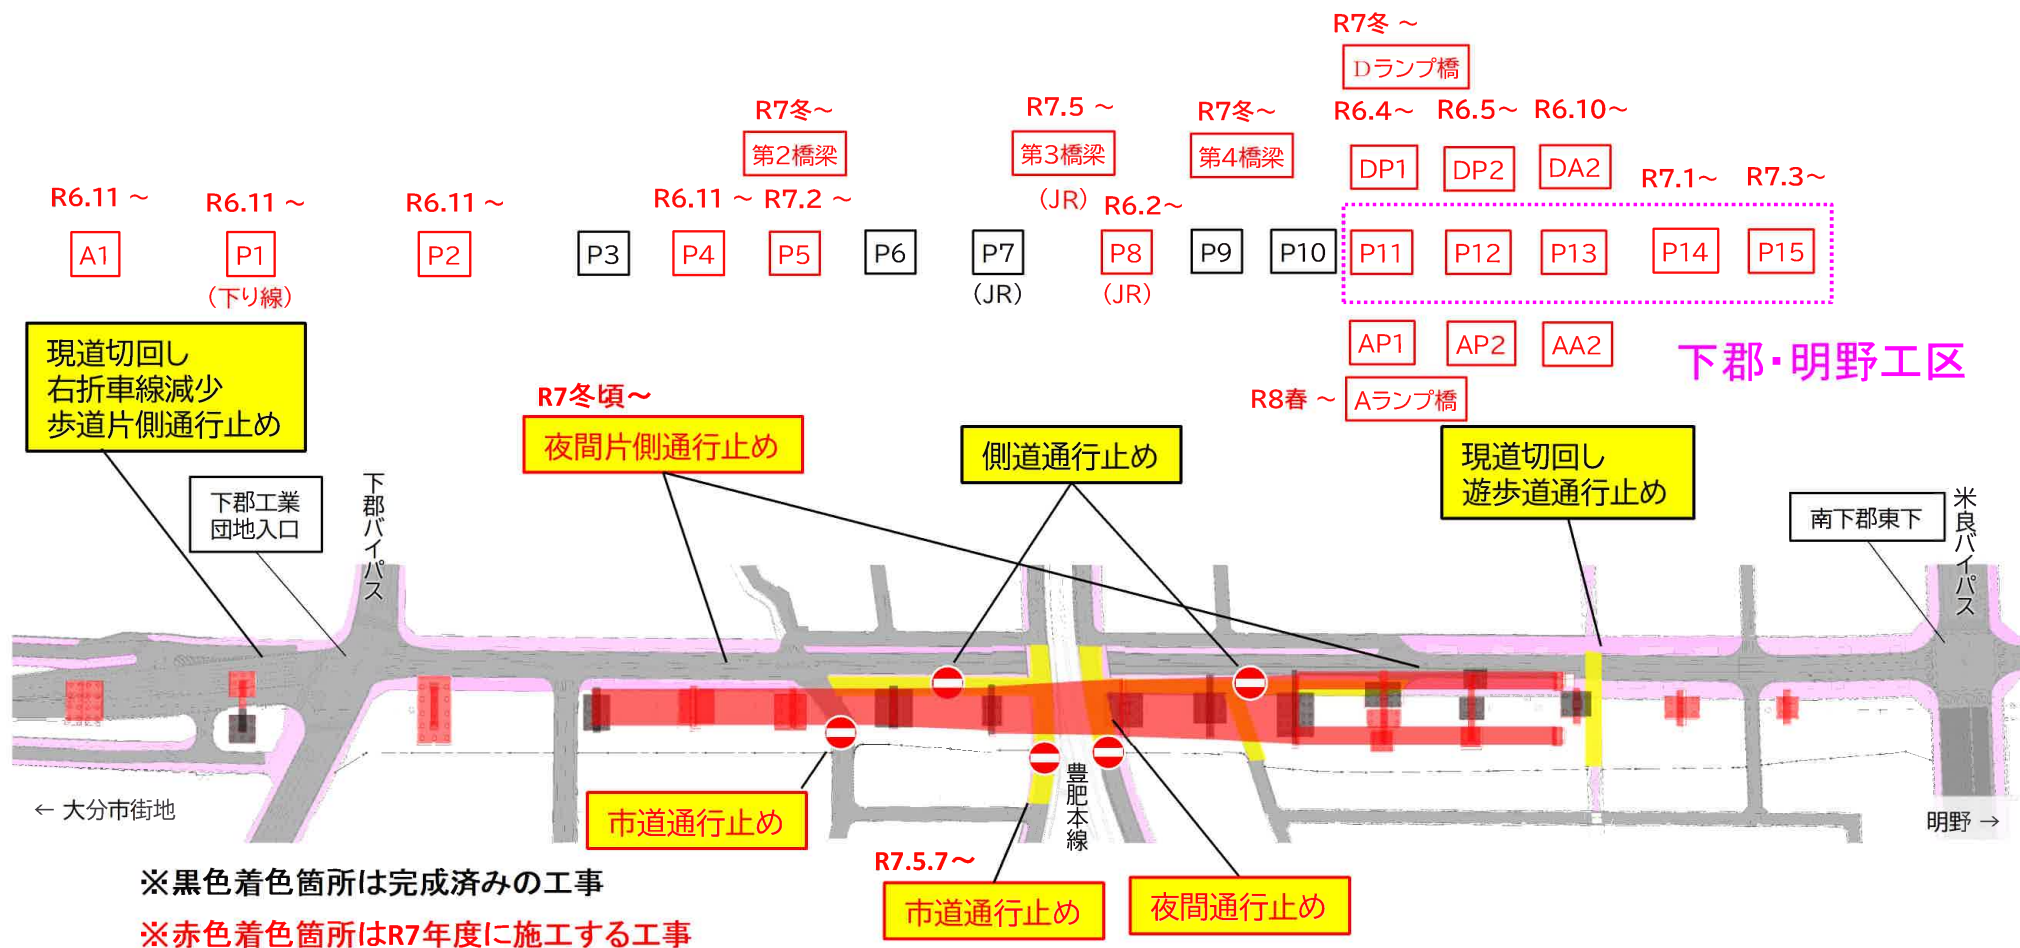

- ・橋梁下部工(橋脚14基、橋台3基)工事、橋梁上部工(5橋)工事を施工予定
- ・現道交通切回し、各種通行止めを伴う

※着手予定は現地条件等により前後する可能性があります

2. 道路計画及び工事概要について




おんせん県おおいた

■ 工事計画について

<令和8年度>

※今後の進捗状況により変更の可能性があります

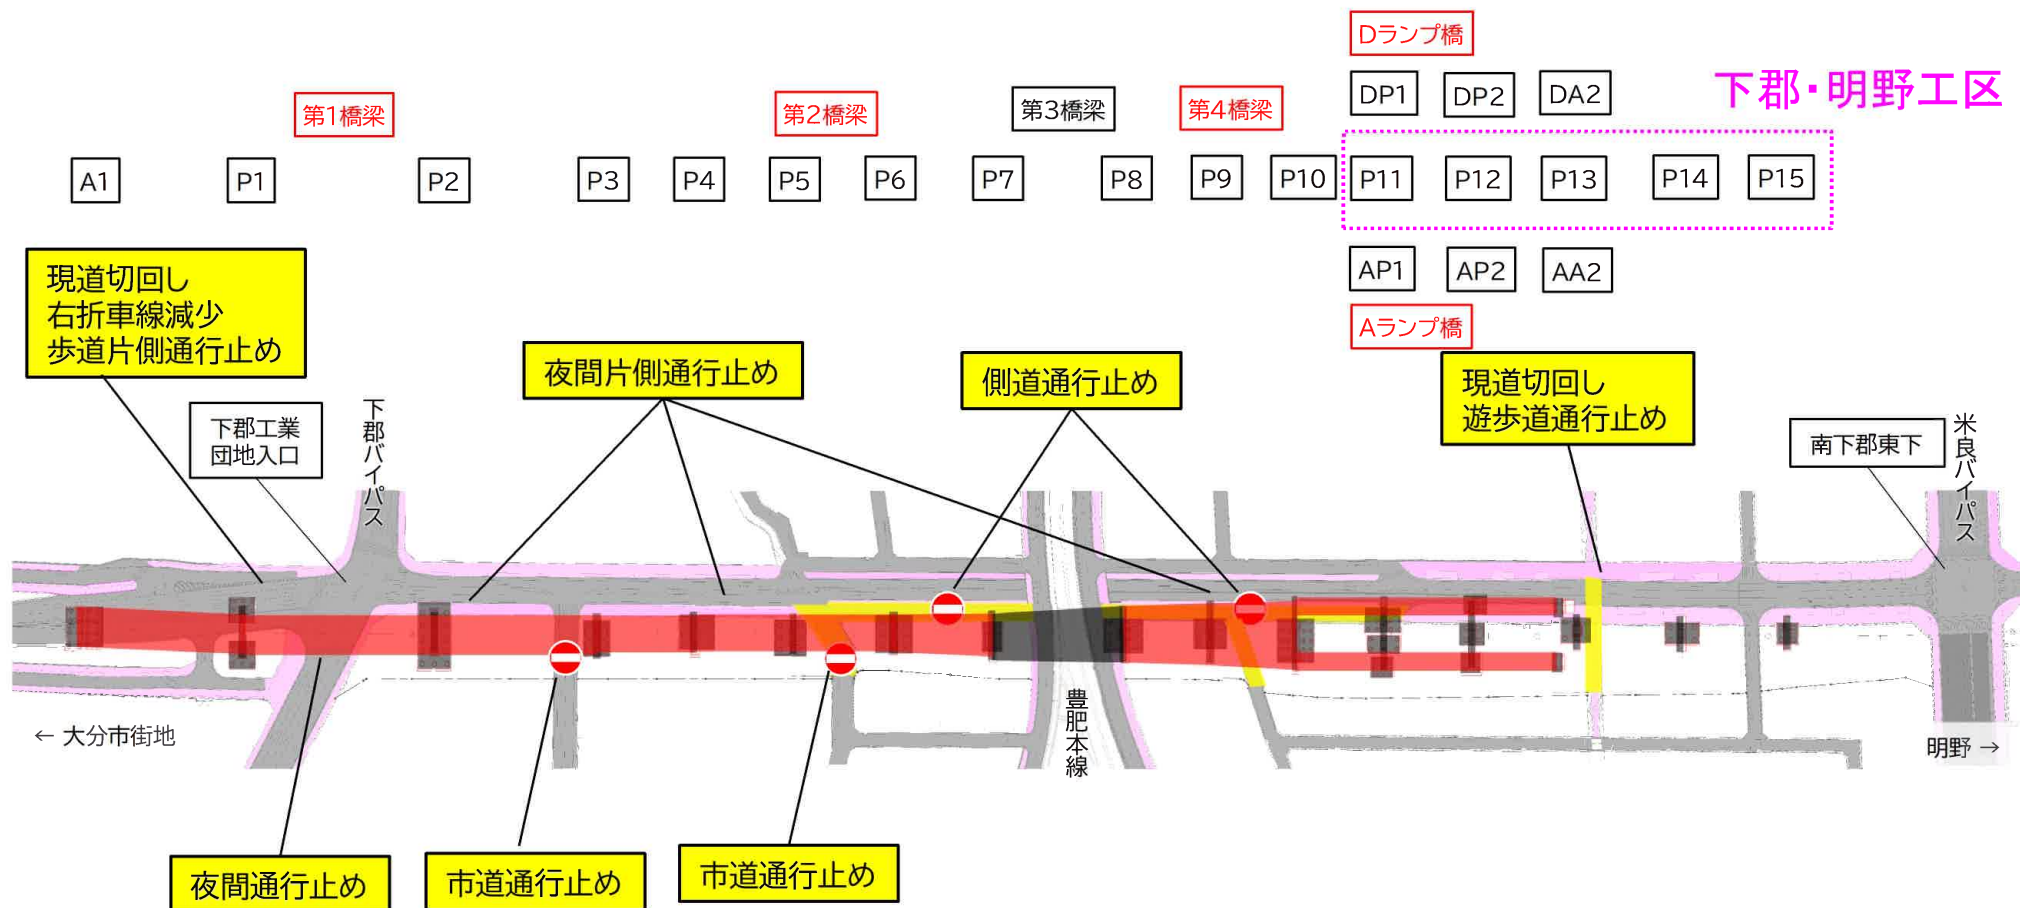

2. 道路計画及び工事概要について


■ 工事計画について

<令和7年度>


【位置図】

R6.4~


現道切回し
右折車線減少
歩道片側通行止め

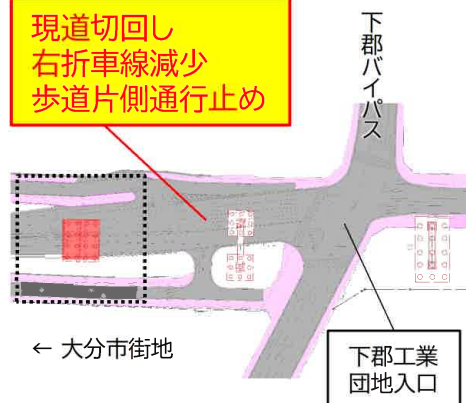


【平面図】

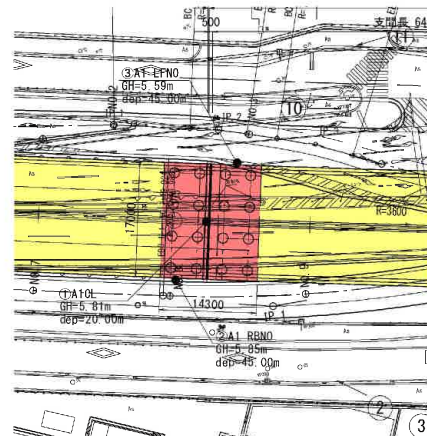

【側面図】

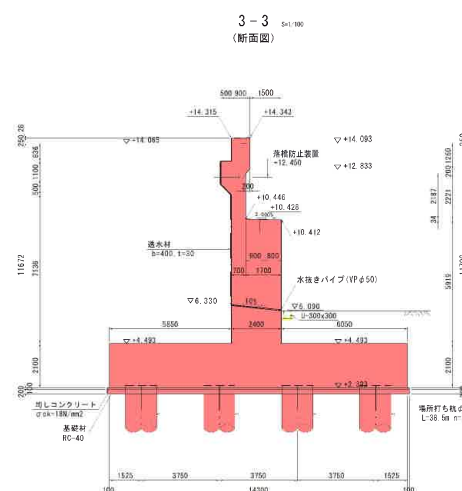

【正面図】

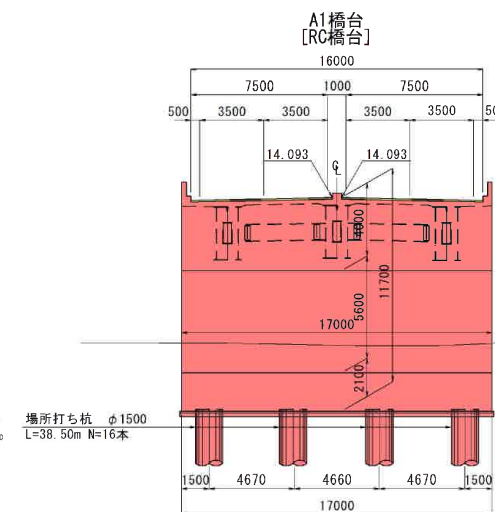

A1橋台工事

- <工 種> コンクリート製橋台
- <工事名> 令和5年度
都計改第1-10号街路改築工事
- <受注者> 新成建設(株)
- <工 期> 令和6年3月～令和8年2月
(予定)


- <工事概要> 場所打杭工
土留・仮締切工
橋台工(フォーミング、柱)
- <通行規制> 現道切回し
機械搬入時等の
一時的な通行制限あり

2. 道路計画及び工事概要について

■ 工事計画について

<令和7年度>


【位置図】

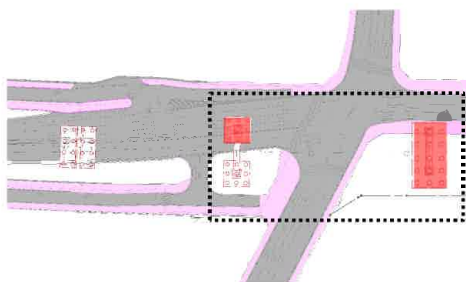


【平面図】



【側面図】(P1)

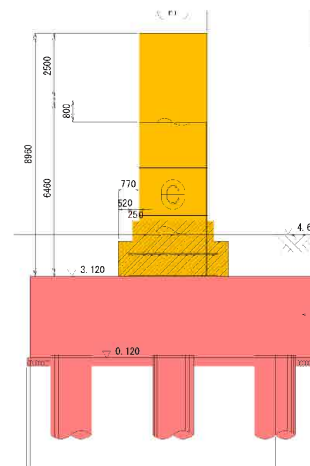

【正面図】(P1)

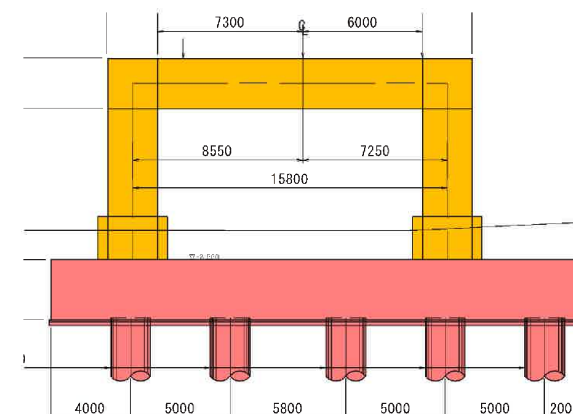

P1・P2橋脚工事

<工 種> 橋脚(フーチング)
<工事名> 令和6年度
都計改第1-3号街路改築工事
<受注者> (株)佐伯建設
<工 期> 令和6年9月～令和8年3月
(予定)

<工事概要> 場所打杭工
土留・仮締切工
橋脚工(フーチング)
<通行規制> 機械搬入時等の
一時的な通行制限あり


2. 道路計画及び工事概要について

■ 工事計画について


<令和7年度>

【位置図】


R5. 6月～

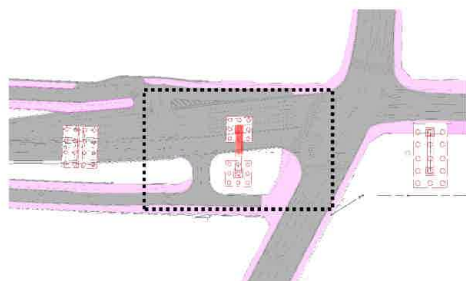


【平面図】

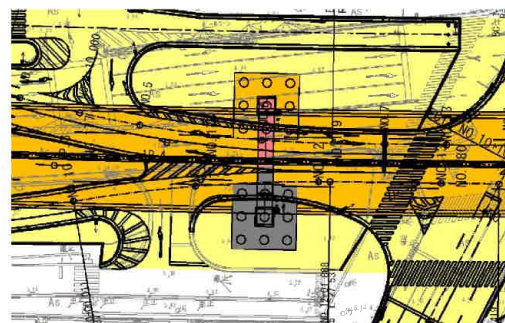

【側面図】(P1)

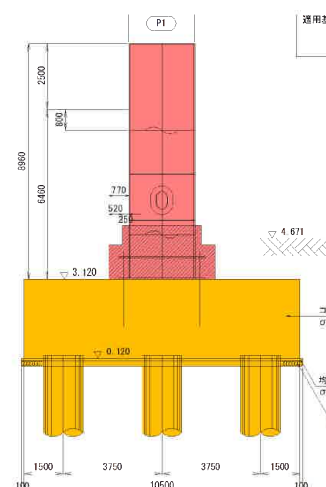

【正面図】(P1)

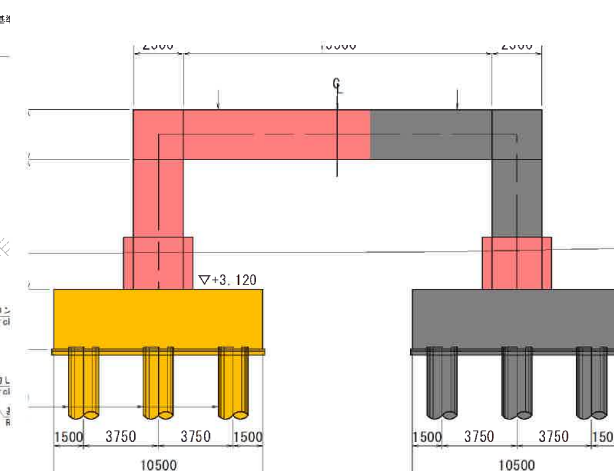

P1橋脚工事

<工 種> 橋脚(鋼製柱)

<工事名> 令和6年度

都計改第1-4号街路改築工事

<受注者> (株)大鐵

<工 期> 令和6年9月～令和7年11月
(予定)

<工事概要> 橋脚工(鋼製柱)


<通行規制> 機械搬入時等の
一時的な通行制限あり

2. 道路計画及び工事概要について


■ 工事計画について

<令和7年度>


【位置図】

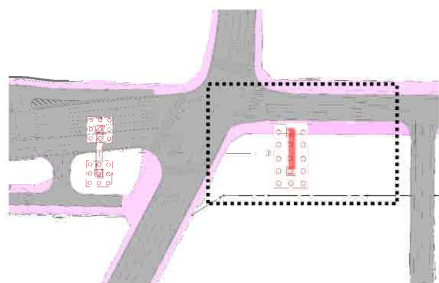


【平面図】

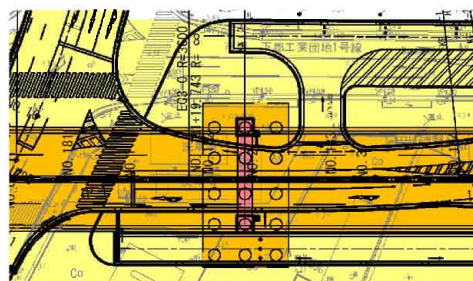

【側面図】

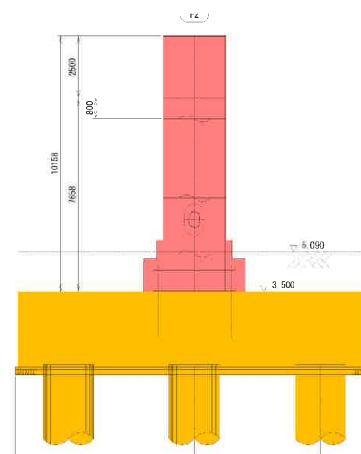

【正面図】

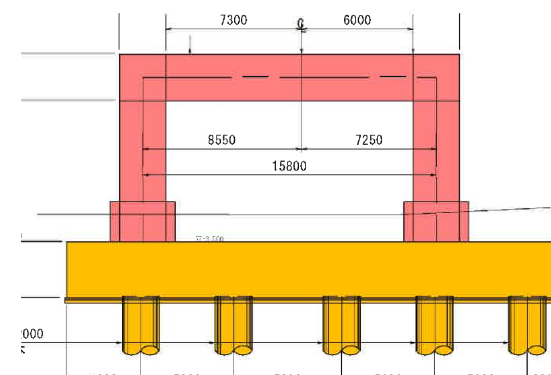

P2橋脚工事

<工 種> 橋脚(鋼製柱)

<工事名> 令和6年度

都計改第1-5号街路改築工事

<受注者> (株)大鐵

<工 期> 令和6年9月～令和8年3月
(予定)

<工事概要> 橋脚工(鋼製柱)


<通行規制> 機械搬入時等の
一時的な通行制限あり

2. 道路計画及び工事概要について


■ 工事計画について

＜令和7年度＞


【位置図】

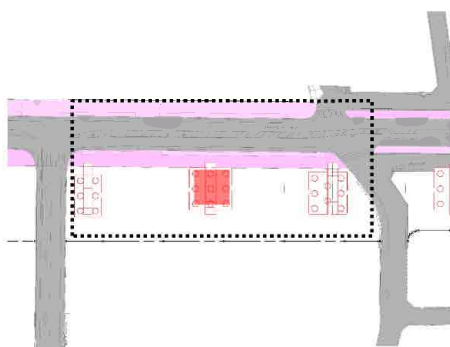


【平面図】

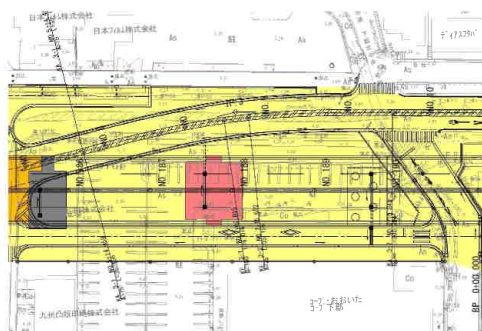

【側面図】

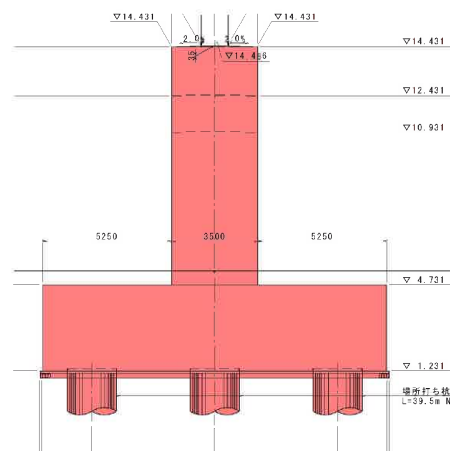

【正面図】

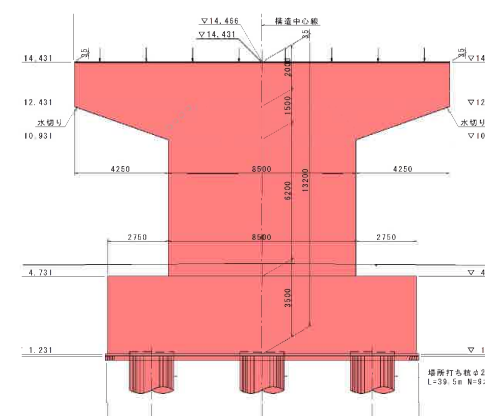

P4橋脚工事

- ＜工 種＞ コンクリート製橋脚
＜工事名＞ 令和6年度
都計改第1-6号街路改築工事
＜受注者＞ (株)佐伯建設
＜工 期＞ 令和6年9月～令和7年11月
(予定)


- ＜工事概要＞ 場所打杭工
土留・仮締切工
橋脚工(フーチング、柱)
＜通行規制＞ 機械搬入時等の
一時的な通行制限あり

2. 道路計画及び工事概要について


■ 工事計画について

＜令和7年度＞


【位置図】

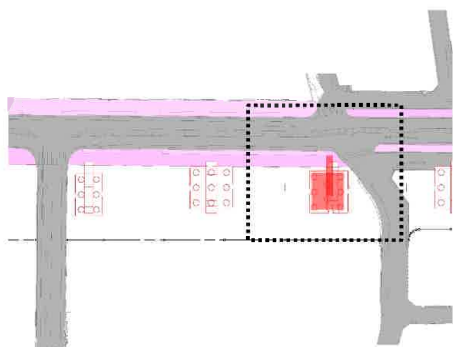


【平面図】

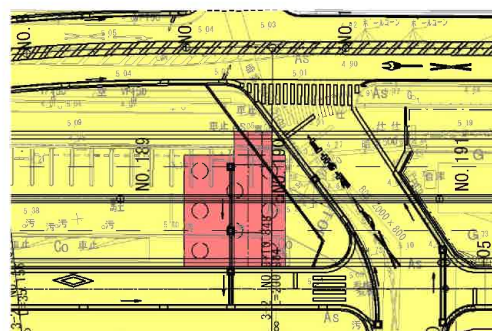

【側面図】

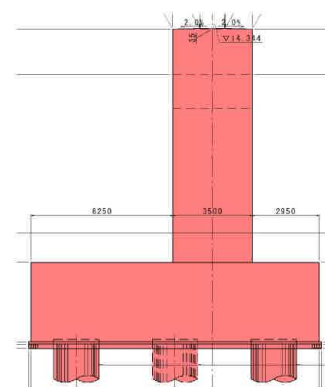

【正面図】

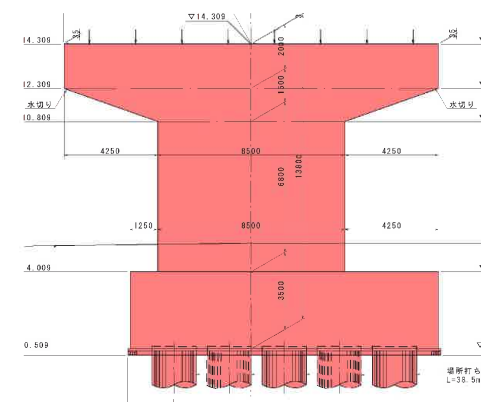

P5橋脚工事

- ＜工 種＞ コンクリート製橋脚
＜工事名＞ 令和6年度
都計改第1-7号街路改築工事
＜受注者＞ (株)佐伯建設
＜工 期＞ 令和7年1月～令和8年1月
(予定)


- ＜工事概要＞ 場所打杭工
土留・仮締切工
橋脚工(フーチング、柱)
＜通行規制＞ 機械搬入時等の
一時的な通行制限あり

2. 道路計画及び工事概要について


■ 工事計画について

＜令和7年度＞


【位置図】

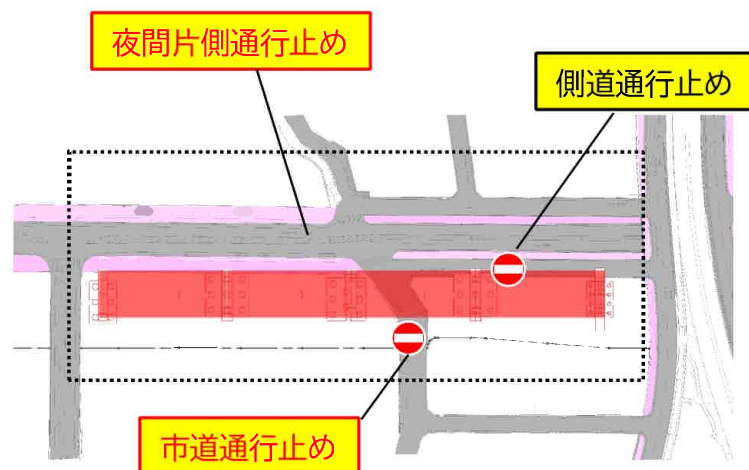

【平面図】

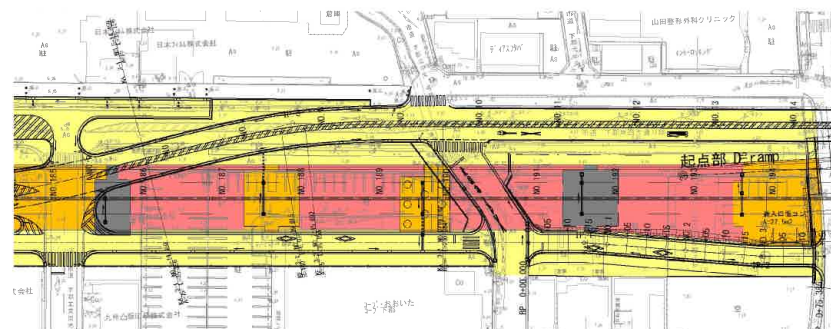

【側面図】

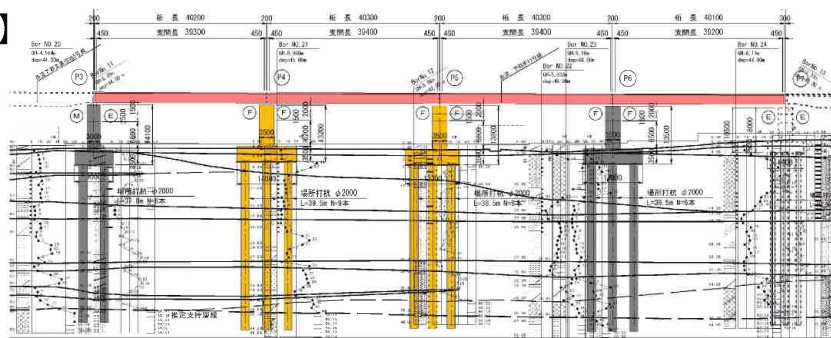

第2橋梁工事

＜工 種＞ PC4径間連結少主桁橋

＜工事名＞ 令和6年度
都計改第1-8号街路改築工事

＜受注者＞ 川田建設(株)

＜工 期＞ 令和7年11月～令和9年3月
(予定)

＜工事概要＞ 桁製作
桁架設工
仮設工


＜通行規制＞ 市道通行止め

2. 道路計画及び工事概要について


■ 工事計画について

＜令和7年度＞


【位置図】

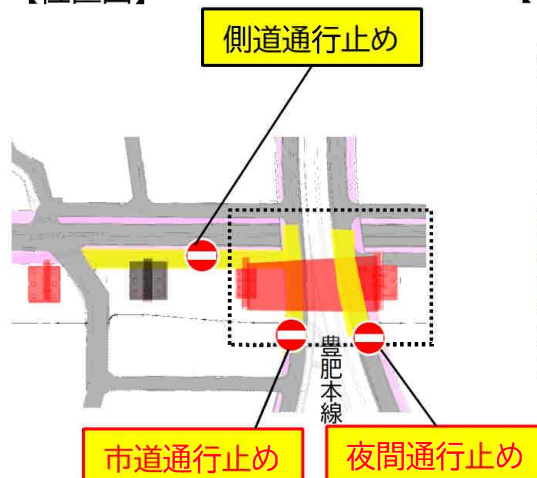

【平面図】

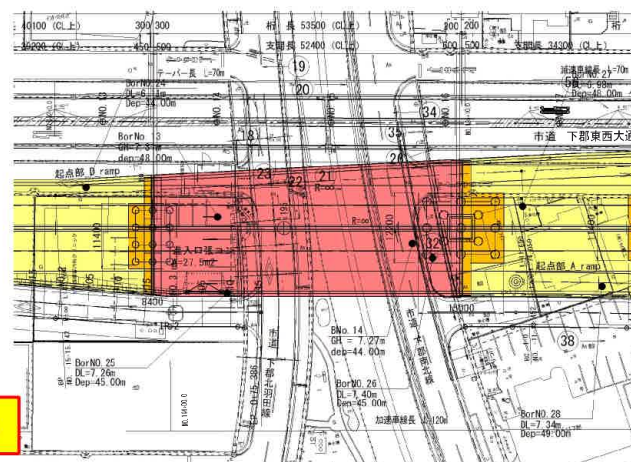

【側面図】

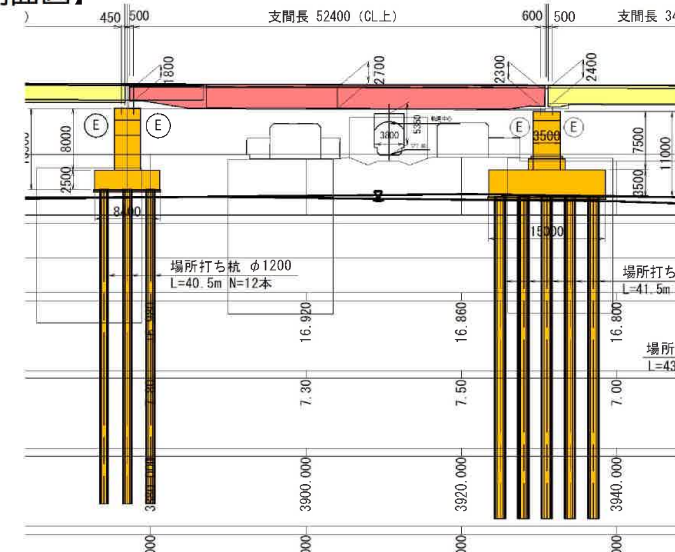

第3橋梁工事

＜工 種＞ 鋼単純少数鉸桁橋

＜工事名＞ 豊肥本線 滝尾・下郡(信)間

144km950m付近

庄の原佐野線下郡高架橋(仮称)

上部工新設工事

＜発注者＞ 九州旅客鉄道(株)

＜受注者＞ 九鉄工業(株)

＜工 期＞ 令和7年4月～令和8年4月(予定)


＜工事概要＞ 桁架設工
仮設工

＜通行規制＞ 側道通行止め
市道通行止め

2. 道路計画及び工事概要について

■ 工事計画について

※主な現場作業工程を示しており、現地条件や規模等により異なる場合があります
※破線で示す工程は鋼製橋脚のみ

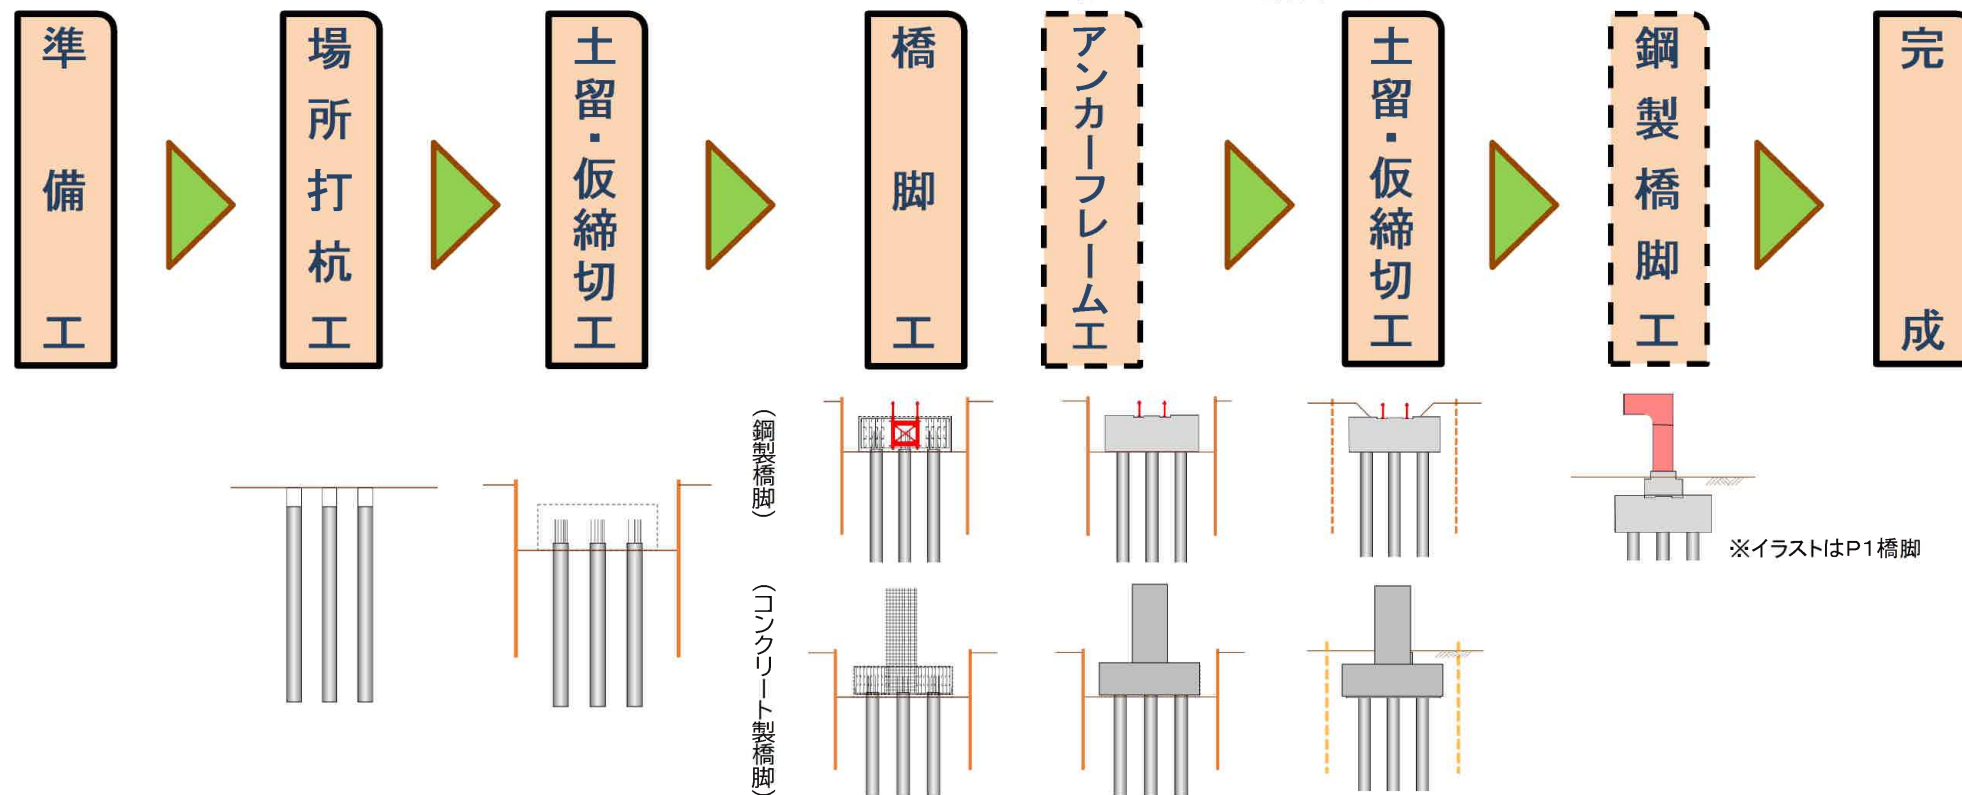

工種	期間
場所打杭工	←→
土留・仮締切工	←→ ←→
橋脚工	←→
アンカーフレーム工	←→
鋼製橋脚工	←→

約1年間

約半年間

2. 道路計画及び工事概要について

■ 市道下郡北羽田線全面通行止めについて

地域のみなさまへ

庄の原佐野線の工事に伴い市道下郡北羽田線が全面通行止となります。

令和7年5月7日(水)9:00～令和7年9月30日(火)




通行の際は、案内看板等に十分ご注意ください。
ご不便をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

<お問合せ先> 大分県大分土木事務所道路建設課 TEL:097-558-2148

地元の皆さまには、
地区回覧で周知を行っています

2. 道路計画及び工事概要について

■ (都) 庄の原佐野線 (下郡工区) 通行規制について

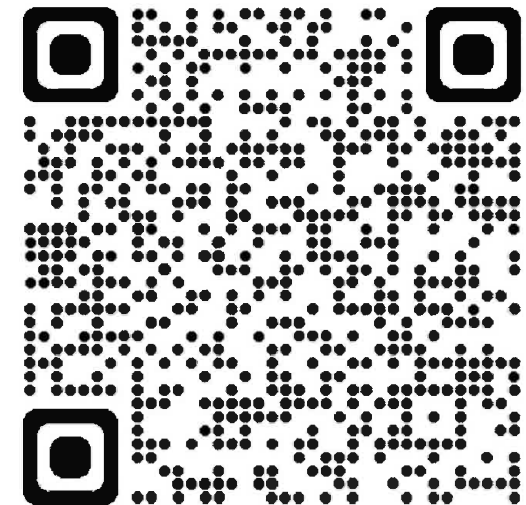

↑こちらのQRコードからも
アクセスできます

大分土木事務所のホームページでも
通行規制情報を発信しているので、ぜひご確認ください

URL・・・<https://www.pref.oita.jp/site/oita17004/syounoharu-tsuukoukisei.html>
